



**La salud
es de todos**

Minsalud

INFORME DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

Enero – Marzo de 2020

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

Contenido

- 01. OBJETIVOS TRANSFORMACIONALES
- 02. REPORTE CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES
- 03. EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2020
- 04. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
- 05. BALANCE SisCONPES
- 06. SINERGIA
- 07. CONTRATOS PLAN
- 08. REPORTE POSCONFLICTO



Adicionalmente, con el apoyo de los delegados del Despacho del señor Ministro, los Viceministerios y Secretaría General, se conformó un Comité Interno de Cumplimiento el cual se reúne periódicamente para hacer seguimiento al avance de las diferentes estrategias y acciones formuladas, así como la generación de lineamientos que contribuyan a logro de los objetivos y metas del Ministerio.

En este marco y ante el volumen y complejidad de los procesos de generación de reportes de información, se identificó la necesidad de desarrollar un mecanismo que facilite la gestión de seguimiento y evaluación; que permita a los diferentes niveles organizacionales una visión integral de los retos del Ministerio; el acceso a información pertinente, oportuna y actualizada y principalmente que contribuya a la toma de decisiones.

Es importante mencionar que el MSPS debe reportar los siguientes informes, así:

MAPA DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEL MSPS

Externos

Presidencia de la República
Departamento Nacional de Planeación
Secretaría de Transparencia
Entes de control
Organismos internacionales
Contraloría General de la República
Comisión Nacional del Servicio Civil
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones



Internos

Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - OAPES



01. Objetivos Transformacionales

Objetivos que por su alta complejidad, importancia social y transversalidad, requieren de una amplia articulación intersectorial, cuentan con un *seguimiento estructurado y constante por parte de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento*

INDICADOR DE RESULTADO – OT – (Balance Enero - Diciembre 2019)

Objetivo Transformacional	Productos	Indicadores	Línea base	Meta 2019	Avance 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta cuatrienio	Meta cuatrienio
1. Fortalecimiento Hospitales	Estrategia de Fortalecimiento Integral en Hospitales Públicos	Porcentaje de desempeño global de los hospitales públicos del país	56,18	77,26	86,17	80,60	83,94	87,28	87,28	Logros Registrados a continuación**

** Resultados Ai Hospital – Diciembre 2019

Diseño e implementación del aplicativo de seguimiento en línea

- Mejoramiento del indicador compuesto de gestión de (56,18 %) en junio de 2018 a (86,17 %) a diciembre de 2019;
- De (800) hospitales en alerta roja en junio de 2018 disminuyó a (117) a diciembre de 2019
- De (cero) hospitales en verde a junio de 2018 pasamos a (475) hospitales en verde a junio de 2019

Fortalecimiento de los servicios de Promoción y Prevención Territoriales

- Asistencia y acompañamiento a la formulación y contratación PIC. En el 1er trimestre del 2019 se logró el (92.7%) Vrs (11%) en 2018

Fortalecimiento de los servicios de baja complejidad

- Diseño y pilotaje de Ai Hospital Contigo en siete territorios priorizados: San Andrés y Providencia, Maicao, Valledupar, Buenaventura, Tumaco, Amazonas y Vichada
- Desarrollo de herramienta para programación y planeación de acciones en baja complejidad
- Fortalecimiento de la respuesta comunitaria en servicios de salud – Gestores Comunitarios
- Fortalecimiento de los servicios hospitalario
- Acompañamiento en formulación y trámite de proyectos para infraestructura y dotación en los priorizados: \$90.508 millones
- Reactivación de servicios de mediana complejidad en Buenaventura
- Reactivación de servicios de mediana y alta complejidad en San Andrés y Providencia
- Remodelación internación y salas de cirugía en Quibdó
- Dotación de baja complejidad en Vichada

INDICADOR DE RESULTADO – OT – (Balance Enero - Diciembre 2019)

** Resultados Ai Hospital – Diciembre 2019

Mejoramiento de la liquidez

- \$16.000 millones ejecutados para pago de pasivos (FONSAET)
- Cartera conciliada por \$52.042 millones.
- Cartera cobrada y recaudada por \$45.075 millones.
- Diseño de propuesta para mejoramiento de giro directo a hospitales de mediana y alta complejidad – en concertación para implementación en 2020.

Mejoramiento de la calidad y la gestión clínica

- Implementación del programa para el control de Infección Asociada a la Atención en Salud – IAAS en 12 hospitales públicos.
- Curso virtual para el manejo seguro de antibióticos, en el que participaron 48 médicos de hospitales priorizados.
- Curso MhGAP para fortalecimiento de atención en salud mental en desarrollo

Objetivo Transformacional	Productos	Indicadores	Línea base	Meta 2019	Avance 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta cuatrienio	Meta cuatrienio
1. Fortalecimiento Hospitales	Implementación del Modelo de Acción Integral MAITE	Porcentaje de avances de cumplimiento del plan de trabajo firmado con los departamentos en el marco de MAITE	0%	25%	49%	47%	68,0	90,0	90%	• Expedición Resolución 2626/19 • Firma de 1466 compromisos con 37 ET • 49% de cumplimiento en los compromisos concertados • 4 encuentros de secretarios departamentales y distritales de salud • Quindío – Huila – Cundinamarca y Boyacá cumplieron el 100% de los compromisos; Córdoba 93% y Casanare 90%

INDICADOR DE RESULTADO – OT – (Balance Enero - Diciembre 2019)

Objetivo Transformacional	Productos	Indicadores	Línea base	Meta 2019	Avance 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta cuatrienio	Meta cuatrienio
	Implementar el Acuerdo de Punto Final Nacional	Porcentaje de recobros por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del Régimen Contributivo prestados a 31 de diciembre de 2019 saneados	0	0	0	50	25	25	100	- Expedición Decreto 1130/19, ordena pago deudas reconocidas por CAPRECOM - Expedición Decreto 1333/19 reglamenta el Art. 245 de la Ley 1955 - Expedición Decreto 1350/19 reconocimiento deuda pública de acreencias pago Servicios y Tecnologías no financiados con recursos de la UPC - Inyección de \$1.13 Billones
2. Disminución de la deuda de las EPS	Implementar el Acuerdo de Punto Final Territorial	Porcentaje de cuentas por pagar de las entidades territoriales por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado prestados a 31 de diciembre de 2019 pagadas	0	10%	15%	30	10	10	60	- Se habilitó a departamentos y distritos por una única vez para atender el pago de deudas por concepto de Servicios y Tecnologías no UPC con Regalías - Se firmaron actas de compromiso con Antioquia; Cundinamarca; Valle del Cauca; Barranquilla; Caldas y Boyacá - Se publicó decreto que establece términos y condiciones para la evaluación del esfuerzo fiscal de las entidades territoriales.


INDICADOR DE RESULTADO – OT – (Balance Enero - Diciembre 2019)

Objetivo Transformacional	Productos	Indicadores	Línea base	Meta 2019	Avance 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta cuatrienio	Meta cuatrienio
3. Ahorro en Gastos de Recobro	Política Farmacéutica Fortalecida	Ahorro en el gasto por recobros como consecuencia de acciones de política farmacéutica (Miles de Millones)	0	\$200	\$271,78	\$200	\$200	\$200	\$800	• Modificación metodológica de regulación de precios de medicamentos. Implementación Circular 06 de 2018. • Referenciación internacional de precios y medicamentos • Recepción y respuesta a comentarios de mercados relevantes para la regulación de precios • Elaboración de informe de seguimiento de la Orden de Compra 0113 de 2019 cuyo objeto es la “Adquisición de medicamentos para el tratamiento del Virus de la Hepatitis C” • Análisis de solicitudes de entidades territoriales para acceder al beneficio de ahorro obtenidos por compra centralizada, para que pacientes del régimen subsidiado reciban el medicamento Sofosbuvir 400mg/ velpatasvir 100 mg
	Estrategia para hacer más eficiente el gasto (No PBS)	Ahorro al sistema de salud por valores máximos de recobro en el régimen contributivo (Miles de Millones)	0	\$20	\$47,6	\$130	\$100	0	\$250	• Aumento de las tecnologías financiadas con UPC en este año: 64 Principios activos y 34 procedimiento por un valor de \$321 mil millones de pesos. • Expedición de la metodología de Valores Máximos de Reconocimiento • Aplicación de la metodología a 1036 grupos relevantes, que son cerca de 16 mil medicamentos

INDICADORES DE GESTIÓN – OBJETIVOS TRANSFORMACIONALES /SIGOB

Objetivo Transformacional	No.	Productos	Dependencia responsable	Hitos	Hitos terminados	Hitos en gestión	Hitos atrasados	% de avance	% cumplimiento
1.Fortalecimiento Hospitales	1	Estrategia de Fortalecimiento Integral en Hospitales Públicos	Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	15	7	8	0	46%	100%
	2	Modelo de Atención Integral Territorial (MAITE), Implementado	Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	7	5	2	0	71%	100%
2. Disminución de la Deuda de las EPS	3	Estrategia para Acuerdo Nacional de Punto Final	Dirección de Financiamiento Sectorial	8	6	2	0	75%	100%
	4	Estrategia para Acuerdo Territorial de Punto Final	Dirección de Financiamiento Sectorial	7	5	2	0	71%	100%
3. Ahorro en Gastos de Recobro	5	Política Farmacéutica Fortalecida	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	10	7	3	0	70%	100%
	6	Estrategia para hacer más eficiente el gasto NO PBS	Dirección de Financiamiento Sectorial	4	4	0	0	100%	100%
				51	34	17	0	67%	100%


AVANCE – OBJETIVOS TRANSFORMACIONALES – SIGOB

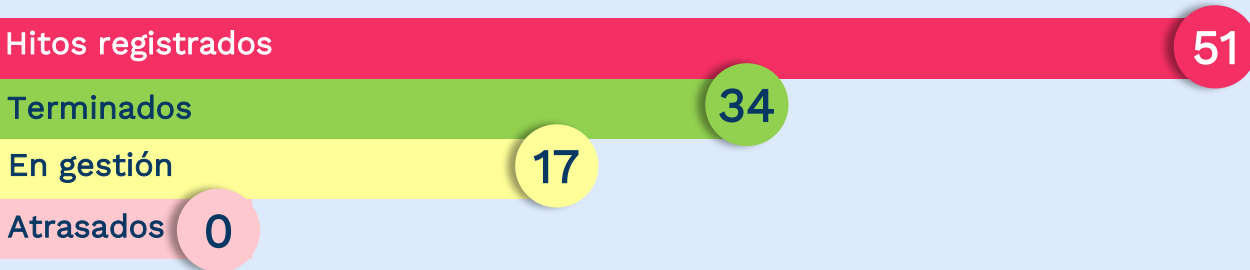

GESTIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD

MÉTODOS E INSTRUMENTOS

Porcentaje de avance de hitos

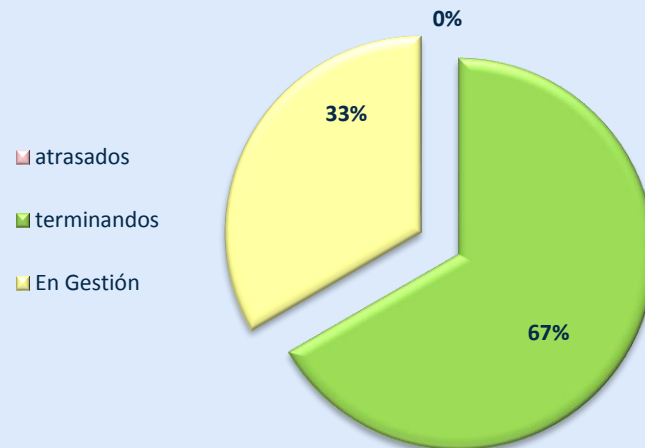

AVANCES EN GESTIÓN – OBJETIVOS TRANSFORMACIONALES / SIGOB

PRODUCTO – Fortalecimiento de Hospitales

AVANCE – (01 de enero a 31 de marzo de 2020)

1

Estrategia de
Fortalecimiento Integral
de los Hospitales
Públicos implementadas



Reporte cuantitativo de avance
Corte: 4to trimestre /2019
86,17%

Indicador SINERGIA:

Porcentaje de desempeño global de
los hospitales públicos del país

Línea base: 56,18%

Meta 2019: 77,26%

Meta 2020: 80,60%

- Lanzamiento de Ai Hospital Contigo para el fortalecimiento de los servicios de baja complejidad en la totalidad de los territorios del país.
- Realización de mesas de trabajo semanal con aseguradores de todo el país para el despliegue e implementación del modelo
- Pasamos de 800 hospitales calificados en rojo (Junio de 2018) a 117 (Diciembre de 2019)
- Reorientación de Ai hospital en el marco de la emergencia por COVID 19

AVANCES EN GESTIÓN – OBJETIVOS TRANSFORMACIONALES / SIGOB

PRODUCTO – Fortalecimiento de Hospitales

1

Estrategia de
Fortalecimiento Integral
de los Hospitales
Públicos implementadas



Acciones desarrolladas en el marco del Covid-19

- A partir de Marzo, en el marco de la emergencia por Covid-19, Ai Hospital se reorientó en todo el país para el alistamiento y fortalecimiento de los servicios como respuesta a la pandemia.
- Se establecieron lineamientos y normas para mejorar la liquidez de la red de prestadores de servicios de salud.
- Decreto 538 de abril 12 de 2020: Habilitación de saldos de cuentas maestras de Salud Pública (\$322 Mil Millones) y en Régimen Subsidiado (\$517 Millones)
- Resolución 619: Compra de cartera Servicios UPC, a la fecha aprobado y girado \$407 Mil Millones
- Se construyó el plan de respuesta en talento humano y elementos para su protección
- Expedición de la Resolución 628 “Llamamiento al TH en salud”
- Expedición de la Resolución 666 “Adopta el protocolo general de bioseguridad”
- Expedición Decreto 488 y 500 de 2020: ARL y EPP
- Se definió el modelo de prestación de servicios a población en aislamiento preventivo obligatorio - (Resolución 521 de 2020)
- Se expedieron los lineamientos para la respuesta de los servicios de salud (Resolución 536 de 2020)

AVANCES EN GESTIÓN – OBJETIVOS TRANSFORMACIONALES / SIGOB

PRODUCTO – Fortalecimiento de Hospitales

AVANCE – (01 de enero a 31 de marzo de 2020)

2

Modelo de Atención
Integral Territorial
(MAITE) implementado



Reporte cuantitativo de avance
Corte: 1er. trimestre /2020

49,0%

Indicador SINERGIA:

Porcentaje de avances de cumplimiento del plan de trabajo firmado con los departamentos en el marco de MAITE

Línea base: 0%

Meta 2019: 25%

Meta 2020: 47%

- Expedición de la Resolución 2626/19 e inicio de su implementación
- Lanzamiento oficial del aplicativo de seguimiento
- Firma de 1.466 compromisos con 37 ET
- 49% de cumplimiento en los compromisos concertados
- Ejecución de 4 encuentros de Secretarios Departamentales y Distritales de Salud con el objetivo de fortalecer la autoridad sanitaria en los territorios
- Posicionamiento de MAITE en los E.T. con inicio de construcción de diagnóstico territorial
- Definición de líderes MAITE dentro del MSPS para apoyar la gestión de los planes de acción propuestos
- Utilización de la estructura del modelo para apoyar a las ET en las respuestas y atención de COVID-19

AVANCES EN GESTIÓN – OBJETIVOS TRANSFORMACIONALES / SIGOB

PRODUCTO – Disminución de la Deuda de las EPS

AVANCE – (01 de enero a 31 de marzo de 2020)

3

Estrategia de Acuerdo
Punto Final Nacional -
APFN



Reporte cuantitativo de avance
Corte: 4to trimestre /2019 *

0%

Indicador SINERGIA:

Porcentaje de recobros por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del Régimen Contributivo prestados a 31 de diciembre de 2019 saneados

Línea base: 0%

Meta 2019: 0%

Meta 2020: 20%

- El decreto de operación de punto final nacional ya fue firmado por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; se encuentra en la Presidencia para firma del Presidente de la República.

A lo largo de la vigencia 2019 se avanzó con:

- Expedición del Decreto 1130/19; ordena pago deudas reconocidas por CAPRECOM
- Expedición del Decreto 1333/19; reglamenta el Art. 245 de la Ley 1955
- Expedición del Decreto 1350/19; reconocimiento deuda pública de acreencias por pago de servicios y tecnologías no financiados con recursos de la UPC
- Inyección al sector de \$1.13 billones.

AVANCES EN GESTIÓN – OBJETIVOS TRANSFORMACIONALES / SIGOB

PRODUCTO – Disminución de la Deuda de las EPS

AVANCE – (01 de enero a 31 de marzo de 2020)

4

Estrategia de Acuerdo
Punto Final Territorial -
APFT



Reporte cuantitativo de avance
Corte 4to trimestre /2019

15 %

Indicador SINERGIA:

Porcentaje de cuentas por pagar de las entidades territoriales por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado prestados a 31 de diciembre de 2019 pagadas

Línea base: 0%

Meta 2019: 10%

Meta 2020: 30%

- Se giraron recursos desde la Nación a las Entidades Territoriales para el saneamiento de la deuda reconocida en su Primera Fase por valor de (\$317.731) millones con base en el resultado de la evaluación del esfuerzo fiscal realizado por el MHCP.
- Las entidades beneficiarias fueron: Barranquilla (\$40.221 millones) / Valle del Cauca (\$157.784 millones) / Antioquia (\$83.885 millones) / Tolima (\$35.839 millones).
- En total con recursos de las entidades territoriales y de cofinanciación se han reconocido servicios y tecnologías No UPC por valor de (\$553.096 millones) así: Atlántico: (\$871 millones) / Barranquilla (\$40.458 millones) / Valle del Cauca (\$200.215 millones) / Antioquia (\$273.837 millones) / Tolima (\$37.714 millones).

* El avance cuantitativo al final de la vigencia 2019 fue 15%, el cual se sustenta en las cuentas pagadas por los Departamentos Antioquia (\$168.845 millones), Valle del Cauca (\$41.303 millones) y el Distrito de Barranquilla (\$236 millones) a 31 de diciembre de la primera fase del saneamiento, sobre el total de la deuda estimada del régimen subsidiado \$1,45 billones.

AVANCES EN GESTIÓN – OBJETIVOS TRANSFORMACIONALES / SIGOB

PRODUCTO – Ahorro en Gastos de Recobro

AVANCE – (01 de enero a 31 de marzo de 2020)

5

Política Farmacéutica
Fortalecida



Reporte cuantitativo de avance
Corte: 4to. trimestre /2019

\$271,780 MM

Indicador SINERGIA:

Ahorro en el gasto por recobros
como consecuencia de acciones de
política farmacéutica

Línea base: 0

Meta 2019: \$200 MM

Meta 2020: \$200 MM

- Entró en vigencia la Circular 10 de 2020, la cual define un precio por unidad de regulación para 203 mercados relevantes adicionales e incorpora 770 presentaciones comerciales de medicamentos con indicaciones para tratamientos de enfermedades respiratorias, diabetes, óseas, oncológicos, desordenes metabólicos, afecciones cardíacas, oftalmológicos, urológicos, entre otras.
- Expedición de la Circular 11 de 2020, que incorpora al régimen de control directo de precios a 5 presentaciones comerciales de medicamentos y ajusta el precio de tres mercados relevantes.
- Se finalizaron los estudios previos para la compra centralizada de 1.100 tratamientos de Epclusa [Sofosbuvir / Velpatasvir] para pacientes del régimen subsidiado y contributivo.

AVANCES EN GESTIÓN – OBJETIVOS TRANSFORMACIONALES / SIGOB

PRODUCTO – Ahorro en Gastos de Recobro

AVANCE – (01 de enero a 31 de marzo de 2020)

5

Estrategia para hacer
más eficiente el gasto
(No PBS)



Reporte cuantitativo de avance
Corte: 4to. trimestre/2019

\$47,6 MM

Indicador SINERGIA:

Ahorro al sistema de salud por
valores máximos de recobro en el
régimen contributivo

Línea base: 0

Meta 2019: \$20 MM

Meta 2020: \$130 MM

- En el mes de marzo, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 500 de 2020 "Por la cual se modifica el artículo 14 de la resolución 205 de 2020" en la cual se habilitó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) a transferir los recursos del presupuesto máximo durante el término de la emergencia sanitaria declarada por COVID-19, de manera anticipada para generar flujo para atender la emergencia. Con base en esta resolución, la ADRES realizó el primer desembolso de recursos a las 38 EPS por valor de (\$380.482) millones.

02.

Reporte Consejería Presidencial para las Regiones

Reporte mensual al cumplimiento de las propuestas de campaña del Sr.
Presidente de la República.

AVANCE – REPORTE CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES

Propuesta	Proyecto	No.	Indicador	Línea Base	Meta 2020	Avance Mes	Avance acumulado
Triple meta para un sistema de salud de calidad, que comprenda: • Una visión integral de la salud del paciente. • La interconexión de la información y el manejo holístico de las enfermedades. • La eficiencia en la contratación y el gasto. Enfocaremos la salud principalmente en la prevención estructural de enfermedades transmisibles y no transmisibles, y actuaremos para reducir la peligrosa expansión de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias en todo el país.	La Triple Meta es un Lineamiento Estratégico Transversal a las acciones que actualmente desarrollada el Ministerio de Salud y Protección Social Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad	1	La Triple Meta es un Lineamiento Estratégico Transversal a las acciones que actualmente desarrollada el Ministerio de Salud y Protección Social	0	100%	8,33%	8,33%
		2	Tasa de mortalidad en niños menores de cinco (5) por Infección Respiratoria Aguda (IRA). (Por cada 1.000 nacidos vivos menores de 5 años)	13,84%	11,20%	N.A. (información anual)	Indicador SINERGIA Reporte Junio 2020
		3	Porcentaje de pacientes Hipertensos Controlados TA <(140/90mmHg)	72,0%	77,20%	N.A. (información anual)	Indicador SINERGIA Reporte Junio 2020
		4	Tasa de mortalidad en niños menores de cinco (5) años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) por cada 100.000 niños menores de 5 años.	3,46	2,80	N.A.	Indicador SINERGIA Reporte Junio 2020
		5	Tasa de mortalidad prematura por Enfermedades Crónicas en población entre 30 y hasta 70 años. (por cada 100.000 personas entre 30 y 70 años)	230,57	226,84	N.A. (información anual)	Indicador SINERGIA Reporte Junio 2020

AVANCE – REPORTE CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES

Propuesta	Proyecto	No.	Indicador	Línea Base	Meta 2020	Avance Mes	Avance acumulado
La sostenibilidad del sistema depende de todos. Formalizar el trabajo significa que todos contribuimos al sistema de salud de manera más transparente, y así solo los más vulnerables dependerán de los subsidios. Se propone: Financiaremos el déficit presupuestal del sector con recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación.	Estrategia para el Acuerdo Nacional de Punto Final Implementada	6	Porcentaje de recobros por concepto de servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC del Régimen Contributivo prestados a 31 de diciembre de 2019, saneados.	0	50%	0%	0%
• Estableceremos un acuerdo de punto final para determinar el valor de la cartera del sector y definir las alternativas de reconocimiento. • Garantizaremos el flujo de recursos a 90 días, con la apropiación suficiente de recursos del presupuesto y con la implementación de sanciones para las EPS que retrasen los desembolsos que les correspondan.	Estrategia para el acuerdo Territorial de Punto Final implementada	7	Porcentaje de cuentas por pagar de las entidades territoriales por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado prestados a 31 de diciembre de 2019 saneadas	0%	30%	0%	15%
• Estimularemos el acceso a los planes voluntarios de salud. • Controlaremos en 4 años el 50% de la evasión y elusión, mediante el fortalecimiento de la veeduría ciudadana y el fortalecimiento de los sistemas de información y su capacidad de análisis en tiempo real.	Fuentes de Ingreso a través de Nuevos Impuestos o gasto de bolsillo	8	Ingresos adicionales por nuevos impuestos o mayor recaudo	0%	\$300 MM	0%	0%
• Promoveremos un Acuerdo Nacional Amplio para dinamizar el proceso de exclusiones al plan de beneficios que permita cubrir los padecimientos de la población sin comprometer la sostenibilidad del sistema. • Instauraremos, como reglamento técnico obligatorio, la implementación de la norma ISO 37001/2016 “Sistemas de Gestión Anti-Soborno” en las instituciones del sector salud.	Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos.	9	Número de servicios y tecnologías excluidas por acto administrativo, de los recursos públicos asignados a la salud.	0	7	0	0%

AVANCE – REPORTE CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES

Propuesta	Proyecto	No.	Indicador	Línea Base	Meta 2020	Avance Mes	Avance acumulado
Todo el sistema de salud (EPS, IPS y agentes gubernamentales) estará en línea y será coordinado y evaluado mediante el uso de Big Data. Así evitaremos abusos anticipadamente y propondremos soluciones según observaciones en tiempo real.	Interoperabilidad de los sistemas de información del Sector, Factura electrónica, autorización de servicios	10	Porcentaje de avance en el diseño y puesta en operación de Sistemas de Información en Línea que involucren actores del sector salud: (Plan de trabajo vigencia 2020 en tres componentes)	0	100%	22%	22%
	Fortalecimiento de Analítica de Datos	11	Porcentaje de avance en el desarrollo de (2) Modelos de Analítica de Datos	0	100%	0%	0%
La administración hospitalaria estará en manos de profesionales serios, escogidos por méritos y evaluados con regularidad.	Estrategia de Fortalecimiento Integral de los Hospitales Públicos Desplegada	12	Porcentaje de desempeño global de los hospitales públicos del país	56,18%	80,60%	N.A.	86,17%
Las historias clínicas serán 100% digitales y estarán al alcance de los profesionales de la salud, donde y cuando lo necesiten los usuarios. Se desarrollarán marcos de desempeños exigentes y transparentes tanto para las EPS como las IPS y las autoridades territoriales responsables de la salud pública, aplicando indicadores detallados y precisos que permitan la vigilancia en calidad, desempeño y resultados.	Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica	13	Porcentaje de avance en la disposición de (3) nuevos servicios de Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHC), para uso por parte de las IPS.	0	100%	24%	24%
Los sistemas digitales de comparación serán la base para la evaluación del precio justo de los medicamentos, en tiempo real, con transparencia y correcciones automáticas, en favor del usuario. Se propone profundizar en la competencia como el mejor mecanismo de control de precios de los medicamentos y, sólo cuando ello no sea posible, continuar la política de regulación de precios garantizando que los precios en nuestro país sean proporcionales a los internacionales, e implementar políticas de negociación centralizada de medicamentos de alto costo.	Política Farmacéutica Fortalecida	14	Ahorro en el gasto por recobros como consecuencia de acciones de política farmacéutica.	0	\$ 200 MM	\$ 272 MM	\$272 MM 136%

AVANCE – REPORTE CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES

Propuesta	Proyecto	No.	Indicador	Línea Base	Meta 2020	Avance Mes	Avance acumulado
Las EPS deben remunerarse por calidad y no solo por cantidad, de manera que se establecerán sistemas de remuneración a las EPS para que no solo dependan del número de afiliados, para lo cual también se considerará la satisfacción verificada por parte de los usuarios.	Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos	15	Porcentaje de avance en la expedición del Acto Administrativo de Ajuste Expost Asociado a Cáncer	0	100%	100%	100%
Desarrollaremos una agenda de buenos hábitos en salud que prevengan el sobrepeso y la obesidad en la población, principalmente en niños y adolescentes. El enfoque en esta materia será multidimensional y propenderá por educar consumidores e identificar mecanismos disuasivos que benefician a la población.	Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad	16	Porcentaje de exceso de peso en adolescentes y escolares	24,4%	24,4%	N.A.	Dato no disponible a la fecha
Equidad regional y profesional del servicio de salud, con un modelo en el cual: - Se fortalecerá la especialidad del médico familiar o general según las necesidades de la población. - Se crearán incentivos para el personal de la salud que trabaje en las regiones donde existe deficiencia de profesionales, no solo a través de un pago acorde al servicio prestado, también al trabajo comunitario y social de la región. - Se ejecutarán las recomendaciones de la CGEM - pensando en la calidad de la prestación del servicio de salud por los profesionales en la materia- para adoptar la recertificación como el modelo de aseguramiento de calidad e idoneidad del ejercicio de la medicina en sus distintos niveles de formación, que debe ser obligatorio y periódico.	Fortalecimiento de la capacidad resolutoria del personal de salud, mediante la conformación de Equipos Multidisciplinarios de Salud EMS	17	Porcentaje de avance en la Construcción de Lineamientos para el fortalecimiento de Equipos Multidisciplinarios en Salud.	0	50%	50%	100%
	Implementación del componente de incentivos al talento humano en salud, en desarrollo de la línea de acción 8 del MAITE (Resolución 2626 de 2019)	18	Porcentaje de avance en la formulación de Lineamientos con incentivos generales que promuevan mejores condiciones para la formación, el ejercicio y desempeño del Talento Humano en Salud, particularmente en las regiones, y Entidades.	0	25%	12%	12%
	Acciones de formación continua para mejorar la calidad e idoneidad los profesionales en sus distintos niveles de formación	19	Porcentaje de avance en la expedición del Acto Administrativo que reglamenta el Sistema Nacional de Formación Continua para el Talento Humano en Salud; Hospitales priorizados dentro del programa Acción Integral al Hospital (AI Hospital),	0	80%	88%	88%

AVANCE – REPORTE CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES

Propuesta	Proyecto	No.	Indicador	Línea Base	Meta 2020	Avance Mes	Avance acumulado
Pondremos como prioridad la prevención del embarazo adolescente con campañas de educación sexual y reproductiva, y el acompañamiento de la familia, para que ninguna niña deba renunciar a sus sueños y oportunidades.	Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad	20	Tasa específica de fecundidad adolescentes de 10 a 14 años (por cada mil mujeres de 10 a 14 años)	2,60	2,30	N.A.	Indicador SINERGIA Reporte Enero 2021
	Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad	21	Tasa específica de fecundidad adolescente de 15 a 19 años (por cada mil mujeres de 15-19 años)	61,00	58,0	N.A.	Indicador SINERGIA Reporte Enero 2021
Proponemos la expansión de cobertura de servicios públicos y sociales en zonas remotas y marginales, aprovechando nuevas tecnologías, para lograr alcantarillado en más del 70% de los hogares rurales, 100% de energía eléctrica y de agua potable, y activación de programas especiales de salud (vacunaciones), deporte y cultura en los municipios de mayor vulnerabilidad.	Plan de Acción Alianza Colombia Vive Saludable	22	Tasa de mortalidad infantil ajustada en menores de un año (por 1.000 nacidos vivos)	16,5	15,00	N.A.	Indicador SINERGIA Reporte Junio 2021



03.

Ejecución Proyectos de Inversión


ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020

DESPACHO DEL MINISTRO

Código BPIN del Proyecto	Nombre del Proyecto de Inversión	Dependencia	Apropiación Inicial (millones \$)	% Comprometido	% Avance Financiero (Obligado/Apropiado)	% Avance Físico	% Avance de Gestión
2017011000477	Fortalecimiento sistema de información de salud y protección social nacional	Oficina de Tecnología de la información y la comunicación	25.800	55,3%	8,1%	47%	21%
2018011000061	Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	Oficina de Promoción Social	10.264	29,0%	3,8%	2%	0%
2018011000059	Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	Oficina de Promoción Social	6.000	8,6%	1,6%	5%	0%
2019011000032	Apoyo al proceso de certificación de discapacidad nacional	Oficina de Promoción Social	5.000	0,6%	0,0%	0%	21%
2018011000035	Implementación de estrategias de comunicación para la promoción y divulgación de los temas relacionados con salud y protección social a nivel nacional	Grupo de Comunicaciones	3.400	44,1%	5,5%	21%	25%
2018011000015	Mejoramiento de la calidad en la gestión de los agentes del sistema de salud a nivel nacional	Oficina de Calidad	1.530	20,5%	6,3%	20%	18%
2018011000208	Fortalecimiento de los procesos para la elaboración de estudios, investigaciones y evaluación de las políticas públicas sectoriales y de la gestión de información para toma de decisiones. Nacional	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - OAPES	1.150	52,7%	15,3%	5%	17%
2018011000085	Asistencia para incrementar la capacidad de respuesta del sector salud hacia la población afectada por emergencias y desastres nacional	Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	1.000	60,5%	12,7%	0%	0%
2018011000183	Fortalecimiento de la cooperación y relaciones internacionales del sector salud nacional	Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	500	47,8%	11,8%	5%	18%
2018011000067	Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el ministerio de salud y protección social nacional	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - OAPES	480	58,6%	16,7%	16%	17%
2018011000073	Implementación de la estrategia de la participación social en el sector salud y protección social nacional	Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	200	49,9%	6,7%	0%	0%

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020

Despacho Ministro

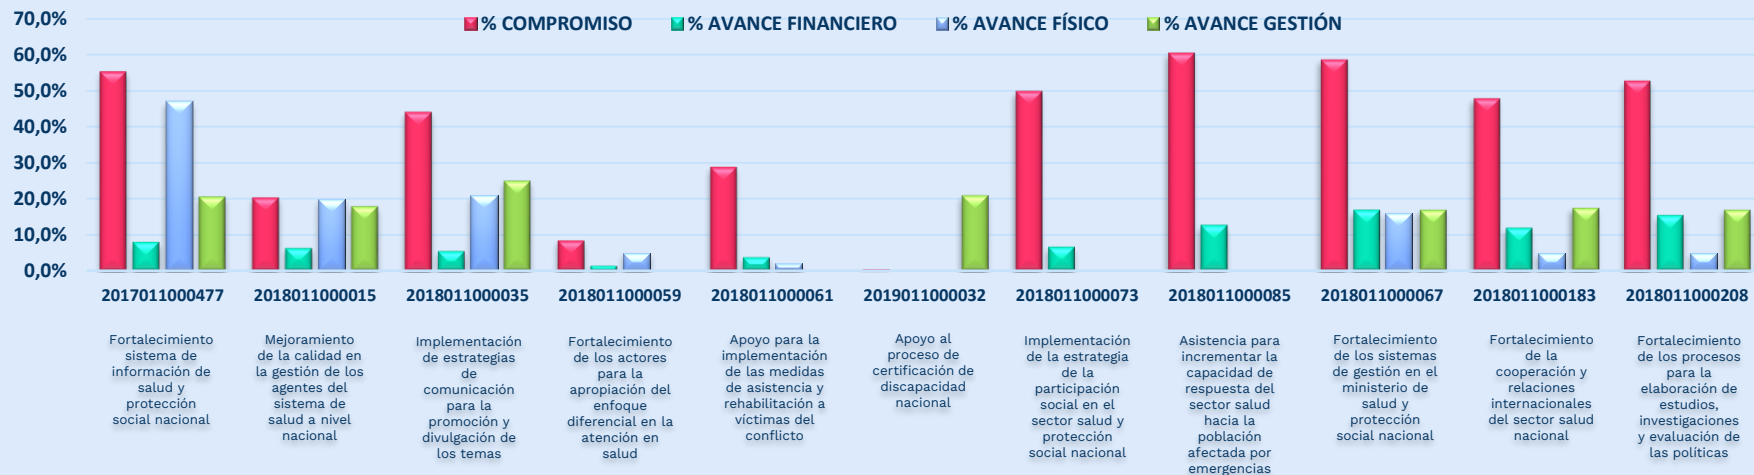

Recursos Inversión Despacho ministro



Apropiación Vigente

55.324.635.000

100%

Comprometido

21.437.083.637

39%

Obligado

3.309.613.177

6%

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020


VICEMINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código BPIN del Proyecto	Nombre del Proyecto de Inversión	Dependencia	Apropiación Inicial (millones \$)	% Comprometido	% Avance Financiero (Obligado/Apropiado)	% Avance Físico	% Avance de Gestión
2018011000202	Implementación de acciones del programa ampliado de inmunizaciones – PAI nacional	Dirección de Promoción y Prevención	363.462	89,7%	55,1%	24,0%	24,0%
2018011000239	Asistencia financiera para promover el proceso de formación de residentes que cursan especializaciones prioritarias para la salud nacional	Dirección de Desarrollo del TH en Salud	55.000	0,0%	0,0%	0,0%	7,2%
2018011000134	Fortalecimiento de la información relacionada con la situación de salud de la población a nivel nacional	Dirección de Epidemiología y Demografía	25.573	11,3%	2,4%	0,0%	0,0%
2018011000211	Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nacional	Dirección de Promoción y Prevención	24.800	40,5%	19,1%	17,0%	0,0%
2018011000213	Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud en condiciones de integralidad, continuidad y calidad nacional	Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	4.950	57,3%	15,1%	24,0%	24,0%
2018011000169	Fortalecimiento de la rectoría y regulación de las tecnologías en salud en Colombia. Nacional	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	3.037	35,8%	9,7%	0,0%	0,0%
2018011000221	Fortalecimiento de la capacidad del ministerio de salud y protección social para orientar la gestión del talento humano en salud. Nacional	Dirección de Desarrollo del TH en Salud	1.000	51,9%	15,7%	19,0%	77,5%

Fuente: Elaboración propia, con base en información registrada en SPI e Informe SIIF Coordinadora Grupo de Planeación – (Corte a 31 de marzo de 2020)

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019

Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios

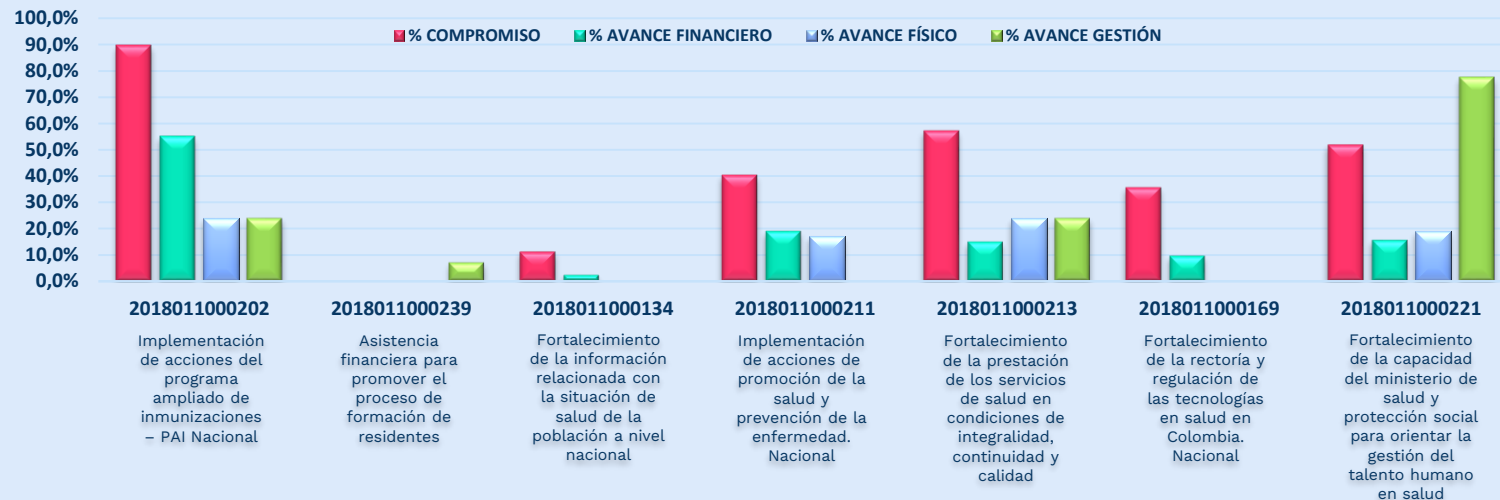

Recursos Inversión Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios



<i>Apropiación Vigente</i>	477.822.895.505	100%
<i>Comprometido</i>	343.349.256.573	72%
<i>Obligado</i>	206.864.944.676	43%

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019


VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Código BPIN del Proyecto	Nombre del Proyecto de Inversión	Dependencia	Apropiación Inicial (millones \$)	% Comprometido	% Avance Financiero (Obligado/Apropiado)	% Avance Físico	% Avance de Gestión
2018011000065	Actualización del plan de beneficios en salud unidad de pago por capitación y su impacto presupuestal respecto a las necesidades en salud de la población nacional	Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	\$4.000	37,5%	8,6%	40%	10%
2018011000060	Análisis de tecnologías en salud que beneficien la prestación de los servicios en salud. Nacional	Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	\$3.300	0,0%	0,0%	0%	0%
2018011000062	Implementación del sistema de gestión financiera y administrativa de los recursos del sector salud a nivel nacional	Dirección de Financiamiento Sectorial	\$1.700	36,8%	15,5%	25%	0%
2018011000246	Fortalecimiento de la rectoría para el mejoramiento del acceso a los servicios de salud en el sistema general de seguridad social en salud -SGSSS- nacional	Dirección de Regulación de la Operación en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones	\$1.550	23,0%	2,2%	13%	25%

Fuente: Elaboración propia, con base en información registrada en SPI e Informe SIIF Coordinadora Grupo de Planeación – (Corte a 31 de marzo de 2020)

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020

Viceministerio de Protección Social

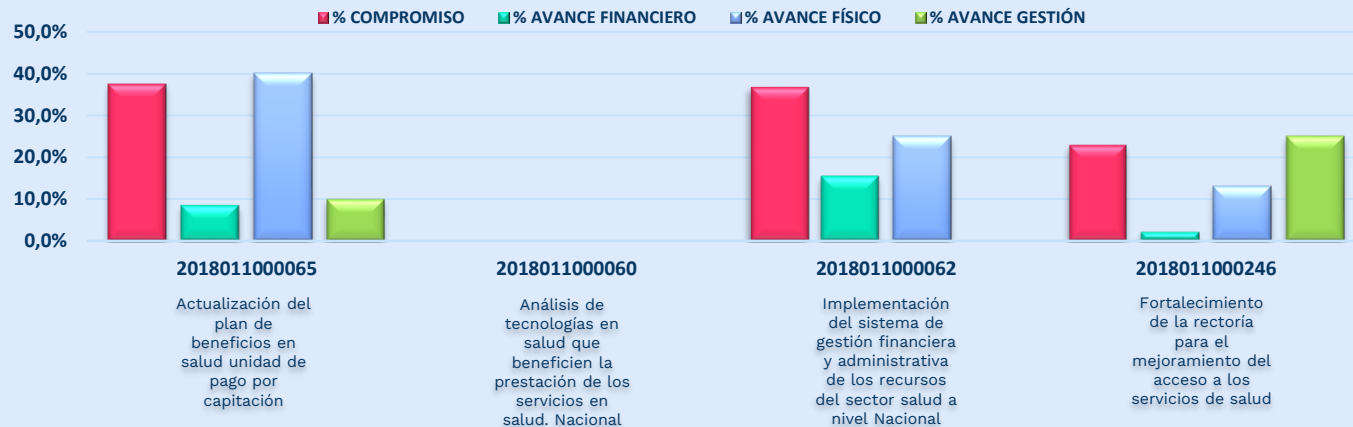

Recursos Inversión Viceministerio de Protección Social




ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020

SECRETARIA GENERAL


Código BPIN del Proyecto	Nombre del Proyecto de Inversión	Dependencia	Apropiación Inicial (millones \$)	% Comprometido	% Avance Financiero (Obligado/Apropiado)	% Avance Físico	% Avance de Gestión
2018011000081	Remodelación de las sedes del Ministerio de Salud y Protección Social Bogotá	Subdirección de Gestión de Operaciones	\$400	0,00%	0,0%	0%	20%
2017011000308	Fortalecimiento del entorno laboral en el ministerio de salud y protección social a nivel nacional	Subdirección de Gestión del Talento Humano	\$300	0,00%	0,0%	0%	0%
2018011000199	Implementación del modelo de servicio al ciudadano en el sector salud a nivel Nacional	Grupo Atención al Ciudadano	\$150	50,9%	6,3%	17%	18%

Fuente: Elaboración propia, con base en información registrada en SPI e Informe SIIF Coordinadora Grupo de Planeación – (Corte a 31 de marzo de 2020)

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019

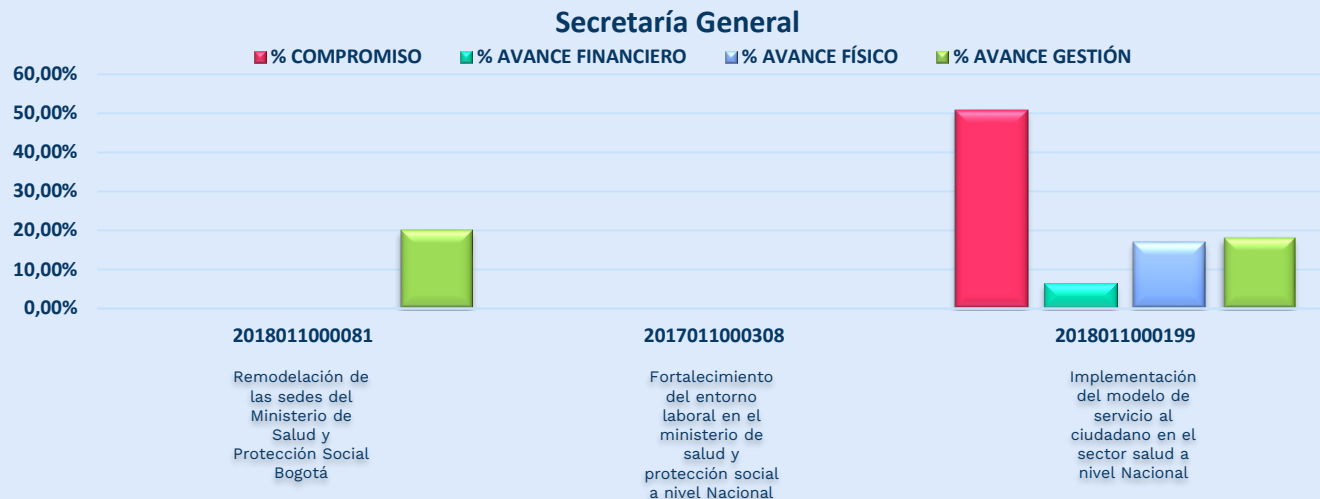

Recursos Inversión Secretaría General



ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020



El MSPS de manera consolidada muestra una ejecución de recursos de inversión del **3,93%**, (apropiado/obligado) “Circular 032 de la CGR” visto así se podría decir que debe trabajar más a fondo en la ejecución de los proyectos de inversión en la vigencia, ya que se debe llegar mínimo al 98% de porcentaje de ejecución.

Recomendaciones

- Es importante que los proyectos carguen un informe mensual en el enlace de anexos; esto permite conservar la trazabilidad de las modificaciones que se realicen a los proyectos, identificar las dificultades que se hayan presentado para el logro de las metas, entre otros.
- Se recomienda realizar control riguroso de los trámites de pago, esto debido a que posiblemente se reciben los productos, sin que el contratista tramite el pago, situación que puede incidir en el desequilibrio de los indicadores de avance de los proyectos.
- Realizar el registro de avance mensual en el aplicativo dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, atendiendo a lo dispuesto en la Circular 0032 del 19 de julio de 2019.

04.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Las estrategias del Esquema de Seguimiento y Reporte definen, dentro de sus componentes, que las entidades del Gobierno Nacional deberán reportar los avances de los indicadores de su responsabilidad, con corte a diciembre del año inmediatamente anterior, en los tres meses siguientes al cierre de la vigencia (cuando aplique) a partir de la fecha de aprobación del presente documento CONPES. Dicha información será reportada al DANE, en su calidad de coordinador y rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN), conforme a los protocolos y mecanismos que dicha entidad disponga para la entrega de información.

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)

Balance reporte Indicadores Nacionales y Meta País

**OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE**

232 INDICADORES

**156 Nivel
Nacional**

53 MSPS


1 INS



**13 metas intermedias
cumplidas**



**19 indicadores tienen
como fuente
encuestas**



**6 indicadores faltan
por reporte o ajuste
de información**



**16 metas intermedias
con incumplimiento**

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)

Balance reporte Indicadores Nacionales y Meta País

Metodología de análisis

El siguiente análisis se realiza teniendo en cuenta dos criterios:

- El comportamiento del indicador en relación con la línea de base. Frente a la variable se analizó si el indicador aumenta o desciende de forma positiva o negativa.
- El comportamiento del indicador en relación con la meta definida para 2018. Frente a esta variable se analizó el cumplimiento de la meta 2018.


TABLA DE CONVENCIONES

	Disminución negativa
	Disminución positiva
	Aumento negativo
	Aumento positivo
	Incumplimiento de meta 2018
	Cumplimiento de meta 2018
	En proceso de ajuste
	Fuente encuesta

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS – (Corte: 2019)

ID Indicador	Nombre del indicador	Línea base	Meta Intermedia a 2018 (2020)	Meta Proyectada a 2030	2015	2017	2018	2019	Análisis
1.3.1.C	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	95,7% (2016)	97%	99%	97,58%	94,88%	94,66%	94,98%	
2.1.2.C	Porcentaje de menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva	36,10%	40%	51%	36,1%	N.D.	N.D.	N.D.	
2.2.1G	Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años	10,80%	8,50%	5%	10,8%	N.D.	N.D.	N.D.	
2.2.2.G	Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años	1,60%	1,20%	0,90%	1,6%	N.D.	N.D.	N.D.	
2.2.3C	Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años	6,83	6,5	5	6,83	5,84	9,06		

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)

ID Indicador	Nombre del indicador	Línea base	Meta Intermedia a 2018 (2020)	Meta Proyectada a 2030	2015	2016	2017	2018	Análisis
3.1.1.G	Razón de mortalidad materna a 42 días	53,7	51	32	53,71	51,27	51,01	45,29	
3.1.2.G	Proporción de partos atendidos por personal calificado	99%	99%	99%	99,00%	99,03%	98,98%	98,42%	
3.1.3.C	Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales	88,4%	89%	93%	88,42%	88,43%	87,70%	86,10%	
3.2.1.G	Tasa de mortalidad neonatal	7,01	6.9	6	7,01	7,01	6,9	6,96	
3.2.2.G	Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años (ajustada)	18,73	18	15	18,73	18,18	16,50	N.D	
3.2.3.C	Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año (ajustada)	17,1	17	14	17,1	16,79	N.D.	N.D	

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)

ID Indicador	Nombre del indicador	Línea base	Meta Intermedia a 2018 (2020)	Meta Proyectada a 2030	2015	2016	2017	2018	Análisis
3.3.1.G	Incidencia de tuberculosis	26,4	25	10	26,4	25	26,5	24,43	
3.3.2.G	Incidencia de malaria	5,3	5	2	5,30	7,87	5,1	2,05	
3.3.3.C	Tasa de mortalidad por malaria	4	3,5	2	0,05	0,09	0,04	0,04	
3.3.4.C	Letalidad por dengue	0,22%	0,12%	0,10%	0,22%	0,17%	0,20%	0,22%	
3.3.5.C	Porcentaje de transmisión materno-infantil de la hepatitis B	ND	menor al 10%	menor al 5%	N.D	N.D.	N.D.	N.D.	
3.3.6.C	Porcentaje de personas con criterio de tratamiento y diagnóstico de hepatitis C crónica a quienes se les inicia el tratamiento	ND	50%	80%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
3.3.7.C	Porcentaje transmisión materno infantil del VIH	2,70%	2,70%	2%	2,7%	2,2%	2,2%	1,97%	
3.3.8.C	Tasa de mortalidad por VIH SIDA	5,08	4,9	4	5,08	5,37	5,10	5,40	

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)

ID Indicador	Nombre del indicador	Línea base	Meta Intermedia a 2018 (2020)	Meta Proyectada a 2030	2015	2016	2017	2018	Análisis
3.4.1.G	Tasa ajustada de mortalidad por lesiones auto infringidas intencionalmente	4,47	4,39	4,12	4,87	5,09	5,50	5,72	 
3.4.2.P	Tasa de mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares	83,65	81,3	75	83,65	84,77	82,81	85,82	 
3.4.3.P	Tasa de mortalidad prematura por cáncer de mama, cuello uterino, colon y recto, pulmón, próstata, estómago, linfoma No Hodgkin y Leucemia.	57,6	57	55,2	57,57	59,50	59,9	60,33	 
3.4.4.P	Tasa de mortalidad prematura por diabetes mellitus	14,23	14	11,5	14,23	13,73	13,9	15,13	 
3.4.5.P	Tasa de mortalidad prematura de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	10,31	9,8	81	10,31	10,83	10,20	9,88	 
3.4.6.C	Tasa de mortalidad por tumores malignos en menores de 18 años.	4,5	4,4	3,9	4,5	4,6	4,7	4,63	 
3.4.7.C	Porcentaje de personas atendidas con problemas y trastornos mentales en los servicios en salud	4,10%	4,50%	6,00%	4,1%	3,14%	3,62%	3,76%	 

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)

ID Indicador	Nombre del indicador	Línea base	Meta Intermedia a 2018 (2020)	Meta Proyectada a 2030	2015	2016	2017	2018	Análisis
3.5.1.C	Porcentajes de personas con abuso o dependencia de cualquier sustancia ilícita	2,08%	2%	1%	2.1	N.D.	N.D.	N.D.	
3.5.2.C	Porcentaje de personas con consumo de riesgo y perjudicial de alcohol	11,07%	9%	5%	11.07	N.D.	N.D.	N.D.	
3.7.1.P	Tasa de fecundidad específica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años	63,9	62	46	63,88	61,56	61,11	58,81	
3.7.2.P	Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos modernos	28,50%	35,70%	48,60%	28.5%	N.D.	N.D.	N.D.	
3.7.3.P	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos modernos	61,4%	68,10%	81,40%	61.40%	N.D.	N.D.	N.D.	
3.7.4.C	Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas de su primer hijo.	17,4%	16,5%	12%	17.4%	N.D.	N.D.	N.D.	
3.7.5.C	Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsiguiente	20,1%	19%	14%	20.10%	19.88%	19.65%	20,57%	

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)

ID Indicador	Nombre del indicador	Línea Base	Meta Intermedia a 2018 (2020)	Meta Proyectada a 2030	2015	2017	2018	2019	Análisis
3.8.1.P	Porcentaje de menores de 1 año con terceras dosis de pentavalente	91,4%	93%	95%	91,4%	91,60%	92,5%	93,37%	 
3.8.2.P	Porcentaje de niños de 1 año con vacuna triple viral	94,0%	94,50%	95%	94,0%	93,1%	95,1%	97,77%	 
3.8.3.P	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	95,7%	97%	99%	97,58%	94,88%	94,66%	94,98%	 
3.9.3.C	Incidencia de intoxicaciones por sustancias químicas	70,1	60	47	70,1	80,6	N.D.	N.D	
3.A.1.P	Prevalencia actual de consumo de tabaco	8,3% (2016)	N.D.	7,5%	N.D.	7,0%	7,4%	N.D	 

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)

ID Indicador	Nombre del indicador	Línea Base	Meta Intermedia a 2018 (2020)	Meta Proyectada a 2030	2015	2016	2017	2018	Análisis
5.1.1.C	Porcentaje de municipios que cuentan con mecanismo de articulación intersectorial para el abordaje de las violencias de género.	10,7%	50%	80%	10.7%	11,8%	57,30%	73,3%	
5.2.1.P	Porcentaje de mujeres que han sido forzadas físicamente por el esposo o compañero a tener relaciones o actos sexuales	7,6%	6,15	5%	7,6%	N.D	N.D	N.D	
5.2.2.P	Porcentaje de mujeres que han sido forzadas físicamente por otra persona diferente a su esposo o compañero a tener relaciones o actos sexuales	4,5%	4%	2,5%	4,5%	N.D	N.D	N.D	
5.2.3.P	Porcentaje de mujeres alguna vez unidas que han experimentado alguna violencia física por parte del esposo o compañero	31,9%	31,9%	27%	31,9%	N.D	N.D	N.D	
5.2.4.P	Porcentaje de mujeres que han experimentado alguna violencia física por una persona diferente al esposo o compañero	13%	12%	10%	13,0%	N.D	N.D	N.D	
5.2.5.P	Porcentaje de mujeres, alguna vez unidas, que reportaron violencia psicológica por parte de su pareja	64,1%	63,20%	50%	64,1%	N.D	N.D	N.D	

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)

ID Indicador	Nombre del indicador	Línea Base	Meta Intermedia a 2018 (2020)	Meta Proyectada a 2030	2015	2016	2017	2018	Análisis
5.3.1.P	Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 18 años.	20,6%	19,10%	17,7%	20,6%	N.D	N.D	N.D	
5.3.2.C	Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 15 años	4,0%	3,60%	3,10%	4,0%	N.D	N.D	N.D	
5.6.1.P	Tasa de fecundidad específica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años	63,9	62	46	63,88	61,56	61,11	58,81	
5.6.2.C	Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsiguiente	20,1%	19%	14%	20,10%	19,88%	19,65%	20,57%	
5.6.3.P	Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos modernos	28,50%	35,70%	48,60%	28,5%	N.D	N.D	N.D	
5.6.4.P	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos modernos	61,4%	68,10%	81,40%	61,40%	N.D	N.D	N.D	
5.6.5 P	Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas de su primer hijo.	17,4%	16,5%	12%	17,4%	N.D	N.D	N.D	

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)

ID Indicador	Nombre del indicador	Línea Base	Meta Intermedia a 2018 (2020)	Meta Proyectada a 2030	2015	2016	2017	2018	Análisis
11.7.--	Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que han sido tocados o manoseados sin su consentimiento	9,4%	9,4%	5%	17,9%	N.D	N.D	N.D	
11.7.--	Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que han sido tocadas o manoseadas sin su consentimiento	17,9%	17,9%	8%	9,4%	N.D	N.D	N.D	


OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

05.

Balance SisCONPES

La plataforma SisCONPES muestra la información del avance de las acciones de los documentos CONPES por sector y entidad; en caso del sector salud están en seguimiento 12 documentos, en donde en total se adelantan 82 acciones relacionadas a salud

PORCENTAJE PROMEDIO DEL CUMPLIMIENTO POR SECTOR

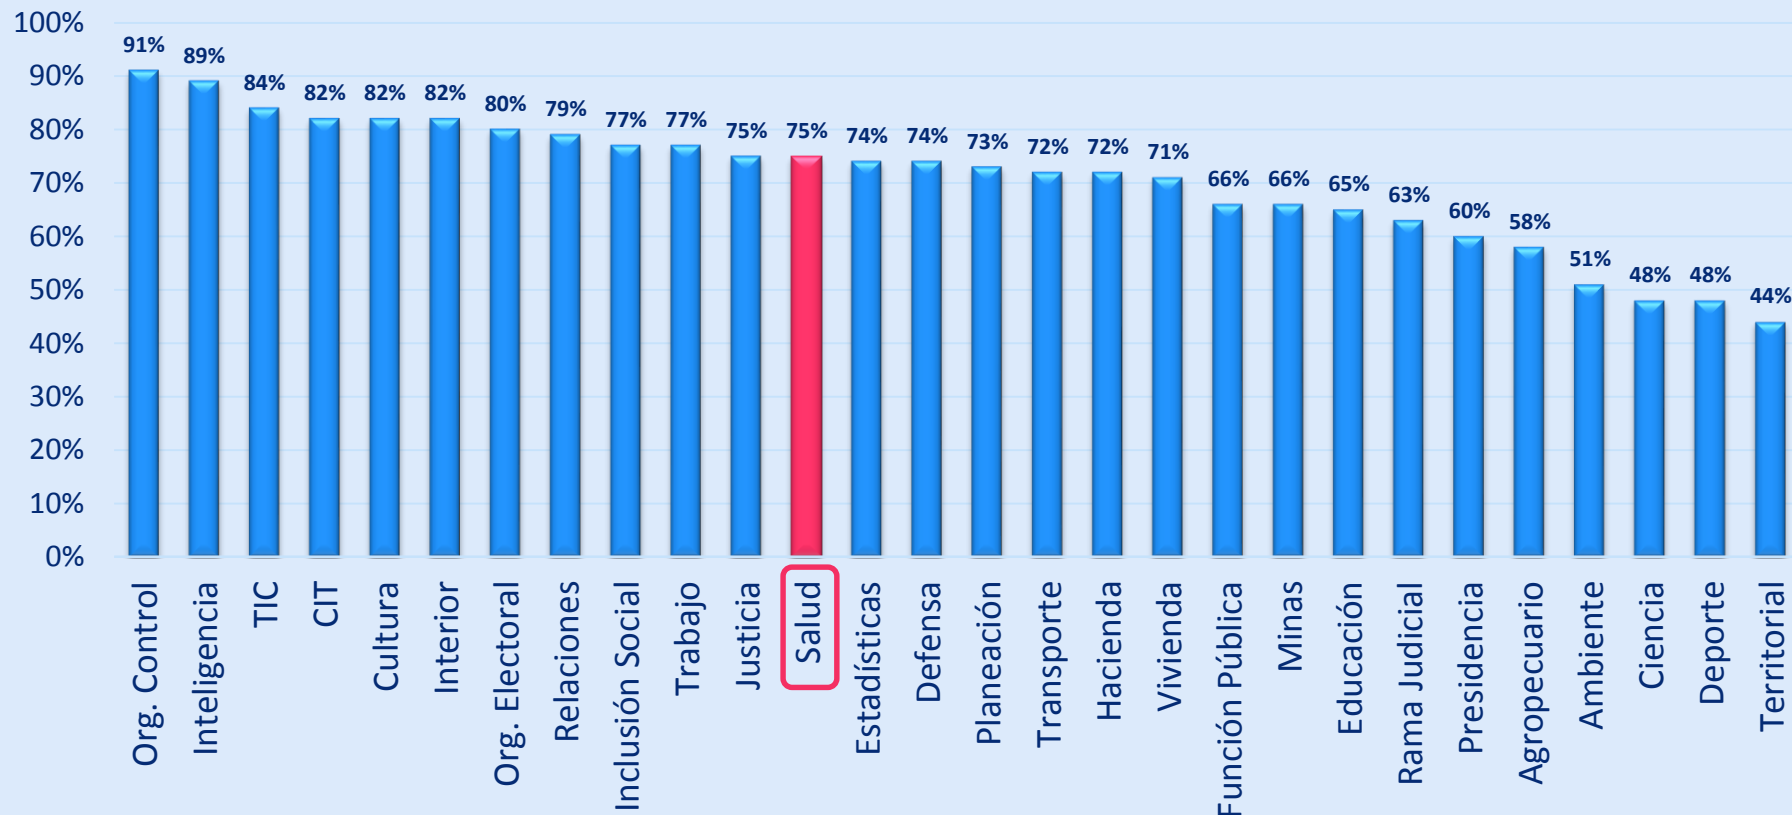

BALANCE SISCONPES

No. CONPES	CONCEPTO	Fecha de Aprobación Documento	Responsables	# Acciones en Seguimiento	Reportadas	Rechazadas	No Reportadas	% Avance cumplimiento acciones
155	Política Nacional Farmacéutica	30/08/2012	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud Dirección del Talento Humano en Salud Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	26	25	0	1	73,67%
166	Política pública de discapacidad e inclusión Social	9/12/2013	Oficina de Promoción Social	5	5	0	0	95,04%
3799	Estrategia para el desarrollo integral del departamento del Cauca	16/01/2014	Dirección de Epidemiología y Demografía	1	0	1	0	30,00%
3805	Prosperidad para las fronteras de Colombia	10/05/2014	Oficina de Promoción Social	2	2	0	0	100,00%
3810	Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural	3/07/2014	Instituto Nacional de Salud	1	1	0	0	100,00%
3868	Política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas	5/10/2016	Subdirección de Salud Ambiental	12	0	0	12	75,69%
3931	Política nacional para la reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP	22/06/2018	Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres Oficina de Promoción Social Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	6	4	0	2	73,61%

BALANCE SISCONPES

No. CONPES	CONCEPTO	Fecha de Aprobación Documento	Responsables	# Acciones en Seguimiento	Reportadas	Rechazadas	No Reportadas	% Avance cumplimiento acciones
3944	Estrategias para el Desarrollo Integral del Departamento de la Guajira y sus pueblos indígenas	8/04/2018	Administración Temporal La Guajira Dirección de Epidemiología y Demografía Oficina de Talento Humano Superintendencia Nacional de Salud Oficina de Promoción Social Dirección de Promoción y Prevención Grupo Curso de Vida	17	15	2	0	78,41%
3947	Estrategias de actuación y coordinación para reducir las afectaciones ante la eventual ocurrencia de un fenómeno de variabilidad climática: El Niño 2018-2019	29/10/2018	Dirección de Promoción y Prevención	1	0	1	0	100,00%
3950	Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela a Colombia	23/11/2018	Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria Dirección de Aseguramiento Dirección de Epidemiología y Demografía Instituto Nacional de Salud	7	7	0	0	98,57%
3956	Política de Formalización Empresarial	8/01/2019	Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas de la Operación del Aseguramiento en Salud INVIMA	5	4	1	0	68,16%
3957	Política Nacional de Laboratorios: Prioridades para mejorar el cumplimiento de estándares de calidad.	8/01/2019	Instituto Nacional de Salud INVIMA Dirección de Epidemiología y Demografía	4	3	0	1	73,33%
3975	Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial		Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	1	1	0	0	100,00%

BALANCE SISCONPES

CONPES en seguimiento

13

Cumpliendo

7

Alerta

5

Atrasados

1


No. CONPES	CONCEPTO	# Acciones en seguimiento	% Avance cumplimiento acciones	Comentario
3799	Estrategia para el desarrollo integral del departamento del Cauca	1	30,00%	Reportó el avance de la acción pero se rechazó por parte de el grupo CONPES, ya que no diligenció la plataforma de la manera adecuada, de acuerdo a los ajustes solicitados; por ende no se vio reflejado el avance de la acción del primer semestre de la vigencia de 2019 que estaría en 30% en la elaboración del protocolo con la concertación dela ruta metodológica de consulta previa para la construcción del componente de comunidades NARP en el capítulo étnico del PDSP.



ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CONPES

33 acciones en cabeza de la Administración Temporal de La Guajira

22 acciones en cabeza de la dirección Departamental de La Guajira



CONPES 3984

Extensión de la vigencia de la medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación escolar, y agua potable y saneamiento básico en el departamento de La Guajira, en aplicación del Decreto 028 de 2008, adoptada mediante el documento CONPES 3883



CONPES 3992

Estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia

Se desarrollan **3** objetivos específicos

3 estrategias de acción con **7** líneas de acción

100 acciones enfocadas a promover la salud mental de la población colombiana a través del fortalecimiento de entornos sociales

Participación de **9** entidades nacionales y con un periodo entre 2020-2023

33 acciones a cargo del Sector Salud

BALANCE SISCONPES



La plataforma SisCONPES muestra la información del avance de las acciones de los documentos CONPES por sector y entidad; en caso del sector salud están en seguimiento 13 documentos, en donde en total se adelantan 88 acciones relacionadas a salud, de las cuales el **82%** se reportaron avance para el segundo semestre de la vigencia 2019.

De igual forma de los 13 documentos CONPES con acciones en temas de salud, 12 se encuentran en estado de gestión y cumplimiento; pero 1 se encuentra en estado de atraso en el seguimiento por las situaciones expuestas en la anterior diapositiva.

Se recomienda a los responsables de cada una de las acciones de los documentos en seguimientos estar más pendientes en las fechas estipuladas que se abre la plataforma para el cargue del reporte semestral para que no hayan inconvenientes con los cargues y rechazos de información, ya que esto generó que no se cargaran de manera correcta el avance de algunas acciones y quedaran sin reporte.

06.

SINERGIA

Realizar seguimiento a la gestión efectuada por el MSPS, respecto del cumplimiento de las metas del PND de gobierno asignadas, con el fin de verificar el control de la calidad y la oportunidad de la información reportada en el portal Web SINERGIA, para la toma de decisiones.

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS - SINERGIA

Sinergia

- Realiza seguimiento a la gestión efectuada por el MSPS, respecto del cumplimiento de las metas del PND de gobierno asignadas, verificar el control de la calidad y la oportunidad de la información reportada en el portal para la toma de decisiones

Objetivo

- Hacer seguimiento y evaluar las políticas públicas del país
- Apoyar al ejecutivo en la consecución de metas mediante la identificación temprana de fortalezas y debilidades en la implementación de políticas.
- Medición objetiva de resultados y logros

INDICADORES SINERGIA - PND 2018 - 2022

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION Y GESTION DE RESULTADOS - SINERGIA -

No.	PROGRAMAS	No. indicadores
1	Alianza por la inclusión y la dignidad de todas las personas con discapacidad	1
2	Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos	29
3	Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos	15
4	Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas	1
5	Promoción de la salud sexual y los derechos reproductivos para niñas, niños y adolescentes	5
6	Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias	2
7	Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país	1
8	Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores	1
9	Familias con futuro para todos	4
10	Salud Pública y prestación de servicios	9
Programas e Indicadores actualmente en SINERGIA		10
		68
		Programas Indicadores
Indicador NO PND -MAITE- Porcentaje de avance en el cumplimiento del plan de trabajo firmado con los departamentos en el marco del Modelo de Acción Integral Territorial.		1
Logros : Concertación Indicadores Étnicos:		
Indicadores Grupos Indígenas		25
Indicadores Grupos NARP - Negros - Afros- Raizales Y Palenqueros		12
Indicadores Grupos Rrom (Gitanos) en SINERGIA (cantidad 4 Actualmente en SINERGIA)		
Total Indicadores Grupos Étnicos		37
TOTAL INDICADORES SINERGIA a cargo del MSPS		106

ESTADO REPORTE INDICADORES EN SINERGIA - Corte 31 de marzo de 2020

No.	Indicadores SINERGIA Dependencias responsables	No. Indicadores a cargo de la dependencia	Estado de reporte corte 31 de marzo en SINERGIA	
			Cualitativo	Cuantitativo
1	Despacho del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios	1	Actualizado	Desactualizado
2	Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	1	Actualizado	Actualizado
3	Dirección de Epidemiología y Demografía	1	Actualizado	Actualizado
4	Dirección de Financiamiento Sectorial	4	Actualizados	Actualizados
5	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud.	1	Actualizado	Actualizado
6	Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	5	Actualizados	Actualizados
7	Dirección de Promoción y Prevención	46	Actualizados	Actualizados
8	Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	2	Actualizados	Actualizados
9	Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones	1	Actualizado	Actualizado
10	Oficina de Calidad	2	Actualizados	Actualizados
11	Oficina de Promoción Social	5	Actualizados	Actualizados
Total Indicadores PND monitoreados en SINERGIA		69		
Porcentaje de indicadores actualizados en SINERGIA a 31 de marzo de 2020			100%	99,9%

INDICADORES POR DEPENDENCIAS - PND 2018 – 2022



Indicadores SINERGIA PND 2018 -2022 Dependencias responsables		No. Indicadores a cargo de la dependencia
1	Despacho del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios	1
2	Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	1
3	Dirección de Epidemiología y Demografía	1
4	Dirección de Financiamiento Sectorial	4
5	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud.	1
6	Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	5
7	Dirección de Promoción y Prevención	46
8	Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	2
9	Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones	1
10	Oficina de Calidad	2
11	Oficina de Promoción Social	5
Total Indicadores monitoreados actualmente en SINERGIA		69

Gestión validación y aprobación Indicadores SINERGIA a 31/03/2020

Fichas técnicas Indicadores étnicos aprobadas	100%
Indicadores con solicitud de anulación al DNP. MSPS no posee información para reporte	4
Indicadores con solicitud de traslado a otro sector	4

INDICADORES TRANSFORMACIONALES SINERGIA - PND 2018 – 2022



FICHA NO.	INDICADOR	DEPENDENCIA	RESPONSABLE
1	Porcentaje de recobros por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del Régimen Contributivo prestados a 31 de diciembre de 2019 saneados		
2	Porcentaje de cuentas por pagar de las entidades territoriales por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado prestados a 31 de diciembre de 2019 pagadas	Dirección de Financiamiento Sectorial	Anwar Rodríguez Chehade
3	Porcentaje de desempeño global de los hospitales públicos del país	Despacho del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios	Jorge Eduardo Suárez Gómez

Los Indicadores Transformacionales son indicadores del PND priorizados por Presidencia de la República. Se monitorean por SINERGIA y SIGOB (Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática) cuyo manejo está a cargo de Presidencia; SIGOB se alimenta de SINERGIA en la parte cuantitativa.

AVANCE CUANTITATIVO SEGÚN PERIODICIDAD CUMPLIDA

Nombre del indicador	Periodicidad	Línea base	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio	Días rezago	
Porcentaje de avance del sistema de afiliación transaccional para salud y riesgos laborales	Semestral	0,0%	32,00%	70%	82%	100%	100%	80%	30	
Porcentaje de desempeño global de los hospitales públicos del país	Trimestral	42,7%	77,26%	81%	84%	87%	87%	75,1%	90	Pendiente dato cuantitativo diciembre 2019
Porcentaje de usuarios que considera fácil o muy fácil acceder a un servicio de salud	Anual	43,40%	44,20%	46,5%	48,7%	51%	51%	68%	60	
Porcentaje de recobros por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del Régimen Contributivo prestados a 31 de diciembre de 2019 saneados	Semestral	0,0%	0,00%	50%	25%	25%	100%	0%	30	
Ahorro al sistema de salud por valores máximos de recobro en el régimen contributivo	Semestral	0 MM	20 MM	130 MM	100 MM	0 MM	250,00	47,60 MM	0	
Valor de la actualización de Plan de Beneficios de Salud	Anual	191 MM	300 MM	100 MM	200 MM	200 MM	800 MM	321 MM	0	
Ahorro en el gasto por recobros como consecuencia de acciones de política farmacéutica	Anual	0 MM	200 MM	200 MM	200 MM	200 MM	800 MM	271,7 MM	90	
Ingresos adicionales por nuevos impuestos o mayor recaudo	Anual	0 MM	0 MM	300 MM	500 MM	750 MM	750 MM	0 MM	30	

AVANCE CUANTITATIVO SEGÚN PERIODICIDAD CUMPLIDA

Nombre del indicador	Periodicidad	Línea base	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio	Días rezago
Porcentaje de EPS que otorgan cita a consulta de medicina general en cinco (5) días o menos	Anual	80%	55%	60%	65%	100%	100%	20%	60
Entidades territoriales con modelo de salud diferencial para zonas con población dispersa implementado	Anual	1	1	2	3	4	4	1,00	30
Porcentaje de cuentas por pagar de las entidades territoriales por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado prestados a 31 de diciembre de 2019 pagadas	Semestral	0%	10%	30%	10%	10%	60%	0%	60
Porcentaje de hospitales públicos con factura electrónica implementada	Anual	0%	0%	50%	90%	100%	100%	0%	30
Porcentaje de sedes de prestadores públicos con servicios de telemedicina habilitados	Anual	6%	6,7%	6,9%	7,1%	7,3%	7,3%	6,8%	30
Víctimas que han recibido atención y rehabilitación psicosocial	Anual	692.999	792.999	912.999	1.032.999	1.152.999	1.152.999	838.138	90
Lineamientos en salud con enfoque diferencial para el pueblo Rrom formulado.	Semestral		0,20	0,40	0,70	1,00	1,00	0,00	30



AVANCE CUANTITATIVO SEGÚN PERIODICIDAD CUMPLIDA

Nombre del indicador	Periodicidad	Línea base	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio	Días rezago
Talleres de socialización de políticas, planes, programas y normas para el Pueblo Rrom, realizados.	Anual		11	11	11	11	44	0	30
Análisis de salud del pueblo Rrom actualizado	Anual		0	0	0	4	4	0	0
Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia de seguimiento en salud para la población Rrom con discapacidad.	Anual		0%	27,2%	36,3%	36,3%	100%	0%	30
Porcentaje de personas que acceden a valoración de certificación y Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD)	Semestral	0,00	0,05%	4,9%	5%	5%	15%	0%	30
Porcentaje de municipios que cuentan con mecanismo intersectorial para el abordaje de las violencias de género	Anual	50%	55%	60%	65%	70%	70%	70,4%	0
Departamentos priorizados y asistidos técnicamente en la implementación del Programa de Prevención de las Violencias Sexuales en el Conflicto Armado y de Atención Integral a Mujeres Víctimas	Anual	0	0	8	16	24	24	0	0



INDICADORES SINERGIA - PND 2018 - 2022

INDICADORES REPORTADOS EN SINERGIA

Indicadores PND			Indicador NO PND	Indicadores étnicos		TOTAL INDICADORES
68			Maite	37		106
Dependencias MSPS	Transformacionales Monitoreados en SIGOB	Rrom (Gitanos)	1	Indígenas	NARP	
62	3	4		25	12	

SINERGIA -Tipos de Indicadores



07.

CONTRATOS PLAN

Instrumento crucial para articular el desarrollo de largo plazo entre la Nación y el territorio, fomentar la concurrencia y alineación de inversiones prioritarias, fortalecer la descentralización, redistribuir la riqueza y enfrentar la inequidad y la pobreza extrema

GESTIÓN AVANCE – CONTRATOS PLAN

 **CHOCÓ – ACANDÍ**
Reposición completa del Hospital del municipio de Acandí.

 **CHOCÓ – VIGÍA DEL FUERTE**
Construcción del Hospital del municipio de Vigía del Fuerte.

 **CAUCA – SANTANDER DE QUILICHAO**
Construcción de la planta física para la reubicación del Hospital de Mediana Complejidad Francisco de Paula Santander.

 **CAUCA – VILLA RICA**
Reposición (reubicación) Hospital Nivel I en el municipio de Villarica, Departamento del Cauca.

 **NARIÑO – IPIALES**
Acceso a servicios de Salud integrales y con calidad para los ciudadanos del cordón fronterizo andino (área de hospitalización del Hospital Civil de Ipiates)

 **TOLIMA – ATACO**
Mejorar la prestación del servicio de atención en salud en el centro de salud Santiago Pérez


 **SANTANDER – FLORIDABLANCA**
Construcción de la Unidad Materno Infantil del Sur del Municipio de Floridablanca - Santander (Proyecto de terminación).

 **ARAUCA – CRAVO NORTE**
Construcción Nuevo Hospital San José en el municipio de Cravo Norte.

 **TOLIMA – SAN ANTONIO**
Remodelación, ampliación y adecuación de la infraestructura física del servicio de urgencias de baja complejidad de la ESE Hospital la Misericordia municipio de San Antonio.

 **TOLIMA – RIOBLANCO**
Construir infraestructura física para la prestación de servicios de salud en el municipio de Rioblanco.

 **GUAINÍA**
Construcción de 9 puestos de salud en la zona rural dispersa en el departamento de Guainía.

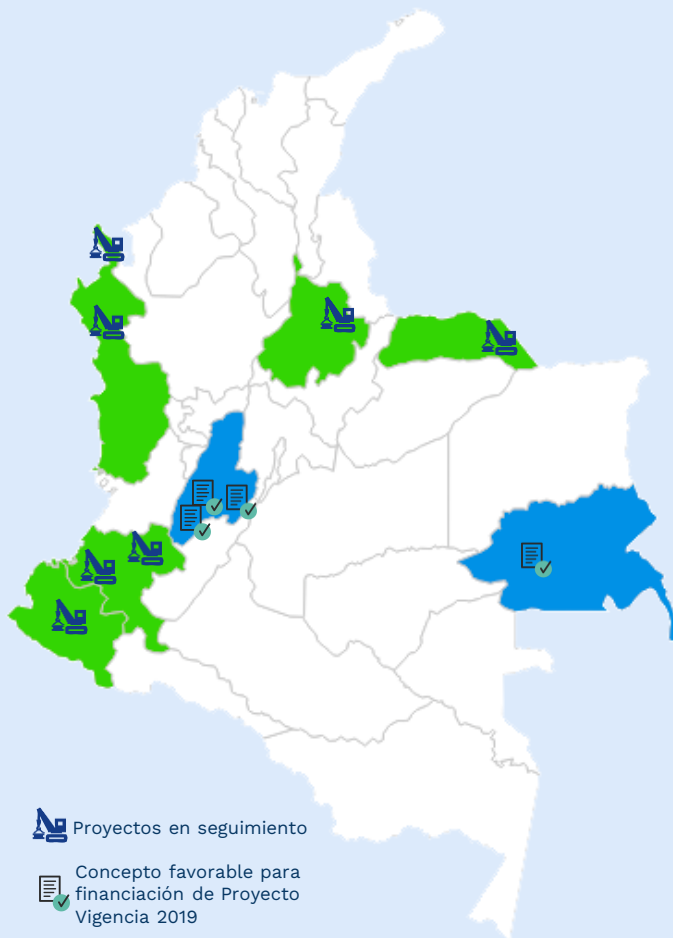

 Proyectos en seguimiento

 Concepto favorable para
financiación de Proyecto
Vigencia 2019

PROYECTOS EN SEGUIMIENTO – CONTRATOS PLAN



CHOCÓ – ACANDÍ

Reposición completa del Hospital del municipio de Acandí.

ESTADO: En Ejecución

VALOR: \$7.223.962.145

Su estado actual a corte del 20 de marzo de 2020 del avance de las obras, para lo cual informó que el avance físico a la fecha según lo reportado por la interventoría es del 62% ejecutado Vs. el 68,15% programado, estos porcentajes corresponden a la reprogramación del proyecto que tiene como fecha de terminación el 8 de julio de 2020. Financieramente el proyecto reporta ejecutado un 43% Vs. 80% programado.

SANTANDER – FLORIDABLANCA

Construcción de la Unidad Materno Infantil del Sur del Municipio de Floridablanca - Santander (proyecto de terminación).

ESTADO: En Ejecución

VALOR: \$14.065.000.000

De acuerdo a lo indicado por la entidad territorial las obras ya fueron ejecutadas y se encuentran listas para inauguración. No se reportan avances porque para el Ministerio de Salud no existe la evidencia de que el proyecto haya finalizado conforme a lo viabilizado. En espera de el envío de la acta de finalización.



CHOCÓ – VIGÍA DEL FUERTE

Construcción del Hospital del municipio de Vigía del Fuerte.

ESTADO: Ejecutado

VALOR: \$8.848.829.177

El proyecto se encuentra finalizado y en proceso de cierre.



CAUCA – SANTANDER DE QUILICHAO

Construcción de la planta física para la reubicación del Hospital de Mediana Complejidad Francisco de Paula Santander.

ESTADO: Suspensiva

VALOR: \$39.507.119.081

Departamento reporta con corte a 30 de marzo de 2020, que **las obras continúan suspendidas**. Las mismas de acuerdo a lo informado por la entidad departamental han logrado un **avance físico del 25,19%**.

PROYECTOS EN SEGUIMIENTO – CONTRATOS PLAN

CAUCA - VILLARICA

Reposición (Reubicación) Hospital Nivel I en el municipio de Villarica, Departamento del Cauca.

ESTADO: En Ejecución

VALOR: \$7.738.000.000

En estos momentos la obra tiene realizados en su totalidad actividades preliminares como localización y replanteo, descapote, campamento, cerramiento, excavación a máquina, retiro de material de excavación y rellenos. Se están elaborando los concretos de solado, de las zapatas y cimentación del muro de contención que divide las dos terrazas que tiene el proyecto. También se trabaja en la colocación de acero de refuerzo de estas zapatas, del muro de contención, la losa del tanque de almacenamiento de agua y de algunas columnas.

El proyecto tiene un avance real del 11,19% que Vs. lo programado (13,87%) tiene un atraso del 2,68%.

ARAUCA – CRAVO NORTE

Construcción Nuevo Hospital San José en el municipio de Cravo Norte.

ESTADO: En Ejecución

VALOR: \$10.065.541.113

El avance que se reporta da cuenta de una ejecución financiera del 90% y en ejecución de obra de un 51%; las obras actualmente de acuerdo a información brindada por el departamento de Arauca continúan en ejecución, con desarrollo en la parte de acabados para el área de urgencias, suministro de planta eléctrica, acotando que las mismas **aún no han terminado el componente eléctrico, razón por la cual se evidencia una prórroga concedida al contrato de obra por parte de la E.S.E, por un período 4 meses**, la cual amplió el plazo de ejecución hasta julio de 2020.

NARIÑO - IPIALES

Acceso a servicios de Salud integrales y con calidad para los ciudadanos del cordón fronterizo andino (Área de hospitalización del Hospital Civil de Ipiales)

ESTADO: Ejecutado

VALOR: \$8.848.829.177

El proyecto aún continua pendiente de cierre, toda vez que la E.S.E Hospital Civil de Ipiales debe reintegrar la suma de \$ 32.998.509, por concepto de rendimientos financieros.

PROYECTOS EN SEGUIMIENTO – CONTRATOS PLAN

Cifras en Millones de Pesos

No.	Contrato Plan	Proyecto	Estado	Departamento	Municipios	Aporte DNP	Aporte Minsalud	Aporte Minsalud Contratos Plan	Aporte territorio	Aporte otros	Valor total
1	Atrato Gran Darién	Reposición completa del Hospital del municipio de Acandí.	En Ejecución	Chocó	Acandí	-	900	5.523	800	-	7.223
2	Atrato Gran Darién	Construcción del Hospital del municipio de Vigía del Fuerte	Ejecutado	Chocó	Vigía del Fuerte	-	-	5.331	3.517	-	8.848
3	Santander	Construcción de la Unidad Materno Infantil del Sur del Municipio de Floridablanca - Santander (proyecto de terminación).	En Ejecución	Santander	Floridablanca	-	-	7.880	6.185	-	14.065
4	Arauca	Construcción Nuevo Hospital San José en el municipio de Cravo Norte	En Ejecución	Arauca	Cravo Norte	-	-	10.065	-	-	10.065
5	Cauca	Construcción de la planta física para la reubicación del Hospital de Mediana Complejidad Francisco de Paula Santander	Suspendida	Cauca	Santander de Quilichao	15.000	8.629	-	3.818	12.060	39.507
6	Cauca	Reposición (Reubicación) Hospital Nivel I en el municipio de Villarica, Departamento del Cauca	En Ejecución	Cauca	Villa Rica			2.738	5.000		7.738
7	Nariño	Acceso a servicios de salud integrales y con calidad para los ciudadanos del cordón fronterizo andino	Ejecutado	Nariño	Ipiales			7.880	6.185		14.065

CONCEPTO FAVORABLES PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTO VIGENCIA 2019 – CONTRATOS PLAN PAZ

TOLIMA – SAN ANTONIO ✓

Remodelación, ampliación y adecuación de la infraestructura física del servicio de urgencias de baja complejidad de la **ESE Hospital** la Misericordia municipio de San Antonio.



ESTADO:	FINANCIADO
DNP – Contrato Plan:	\$780.000.000
Gobernación Tolima:	\$459.000.000
Municipio:	\$50.000.000
Hospital:	\$50.000.000
VALOR TOTAL	\$1.339.000.000
MODALIDAD:	Remodelación
TIPO DE INVERSIÓN:	Infraestructura
PLAZO:	6 Meses

GUAINÍA ✓

Construcción de 9 puestos de salud en la zona rural dispersa en el departamento de Guainía.



ESTADO:	FINANCIADO
DNP – Contrato Plan:	\$2.700.000.000
Sistema General de Regalías:	\$8.200.000.000
VALOR TOTAL	\$10.900.000.000
MUNICIPIO SEDE:	Inírida, Mapiripana, Barrancominas, Morichal, Puerto Colombia, Pana Pana
NIVEL DE ATECIÓN:	I Nivel
PLAZO:	18 Meses

TOLIMA – RIOBLANCO

Construir Infraestructura física para la prestación de servicios de salud en el municipio de Rioblanco.



ESTADO:	En espera de Financiamiento
DNP – Contrato Plan:	\$9.172.462.140
Municipio Rioblanco:	\$1.800.000.000
VALOR TOTAL	\$10.972.462.140
MODALIDAD:	Obra Nueva
TIPO DE INVERSIÓN:	Infraestructura
PLAZO:	11 Meses

TOLIMA – ATACO

Mejorar la prestación del servicio de atención en salud en el centro de salud Santiago Pérez



ESTADO:	En espera de Financiamiento
DNP – Contrato Plan:	\$2.318.405.904
Municipio Ataco	\$1.000.000.000
Depto. Tolima	\$2.000.000.000
VALOR TOTAL	\$5.318.405.904
MODALIDAD:	Obra nueva
TIPO DE INVERSIÓN:	Infraestructura
PLAZO:	11 Meses

08. PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ

El Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) tiene como objetivo contribuir a la transparencia, facilitar el seguimiento y verificación del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo Final, así como las iniciativas adicionales del Gobierno Nacional tales como políticas, planes, programas, proyectos y recursos para el posconflicto, previniendo cualquier forma de corrupción y dando garantías a la ciudadanía para facilitar el control social y la veeduría ciudadana. En particular, el SIIPO servirá como fuente de información para la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

Punto 1: Hacia un nuevo campo colombiano, Reforma Rural Integral

Pilar 1.3: Desarrollo social en salud



Plan Nacional de Salud Rural (PNSR)

AVANCE 1,54%

Estrategia		Avance cuatrienio
1	Mejoramiento de infraestructura	0%
2	Talento humano cualificado	0%
3	Atención a población dispersa	0%
4	Seguimiento y evaluación	20%

- Se realizó cierre técnico del PNSR a cargo de DNP y Consejería Presidencial para la Estabilización.
- Se realizó proyecto de resolución para su adopción formal del Plan, el cual se publicó el 22 de febrero.
- En este momento se están procesando las múltiples observaciones ciudadanas recibidas.

Nota:

- Al 93% de los indicadores de este punto fueron objeto de solicitud de ajuste, de éstas solo 4 siguen la ruta de este proceso; y el resto (8 indicadores) iniciaron el proceso de formulación de ficha técnica.

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA	CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	Estado de plazo del indicador	Estado formulación de ficha	Reporte cuantitativo 2019	Reporte cualitativo 2020
Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres	A.34	Porcentaje de centros de salud construidos o mejorados en territorios definidos en el respectivo plan	En término	Revisión DNP	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte
	A.34P	Porcentaje de centros de salud construidos o mejorados en municipios PDET	En término	Revisión DNP	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria en Salud	A.34	Porcentaje de centros de salud construidos o mejorados en territorios definidos en el respectivo plan	En término	Revisión DNP	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte
	A.34P	Porcentaje de centros de salud construidos o mejorados en municipios PDET	En término	Revisión DNP	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte
	A.35	Sedes de prestadores de salud públicos con servicios de salud habilitados en la modalidad de telemedicina en los municipios del Plan	En término	Solicitud de ajuste CSIVI	NA	NA
	A.35P	Sedes de prestadores de salud públicos con servicios de salud habilitados en la modalidad de telemedicina en los municipios PDET	En término	Solicitud de ajuste CSIVI	NA	NA

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA	CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	Estado de plazo del indicador	Estado formulación de ficha	Reporte cuantitativo 2019	Reporte cualitativo 2020
Viceministerio de Salud Pública	A.37	Porcentaje de territorios definidos en el respectivo plan con modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas	En término	Revisión dependencia	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte
	A.387	Porcentaje de territorios definidos en el respectivo plan con modelo especial de salud pública para zonas rurales	En término	Revisión dependencia	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte
	A.37P	Porcentaje de municipios PDET con modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas	En término	Revisión dependencia	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte
	A.387P	Porcentaje de municipios PDET con modelo especial de salud pública para zonas rurales	En término	Revisión dependencia	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte
	A.G.11	Porcentaje de subregiones con modelo especial de salud pública, con enfoque de género, para zonas rurales dispersas	En término	Revisión dependencia	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte
	A.G.12	Porcentaje de subregiones con modelo especial de salud pública, con enfoque de género, para zonas rurales	En término	Revisión dependencia	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte
Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud	A36	Densidad estimada de talento humano en salud por 10.000 habitantes en municipios rurales	En término	Solicitud de ajuste CSIVI	NA	NA
	A.36P	Densidad estimada de talento humano en salud por 10.000 habitantes en municipios PDET	En término	Solicitud de ajuste CSIVI	NA	NA


Nota:

- Las fichas técnicas de este indicador se remitieron una vez se contó con la resolución de adopción de MAITE.

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA	CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	Estado de plazo del indicador	Estado formulación de ficha	Reporte 2017	Reporte 2018	Reporte cuantitativo 2019	Reporte cualitativo 2020
Oficina de Gestión de Calidad	A.34P	Sistema de seguimiento y evaluación permanente para garantizar la calidad y oportunidad de la atención, implementado	En término	Aprobada	Aprobado	No aprobado	*9 meses de rezago	Actualizado

Avance cuantitativo del indicador VS la meta (Por vigencia)

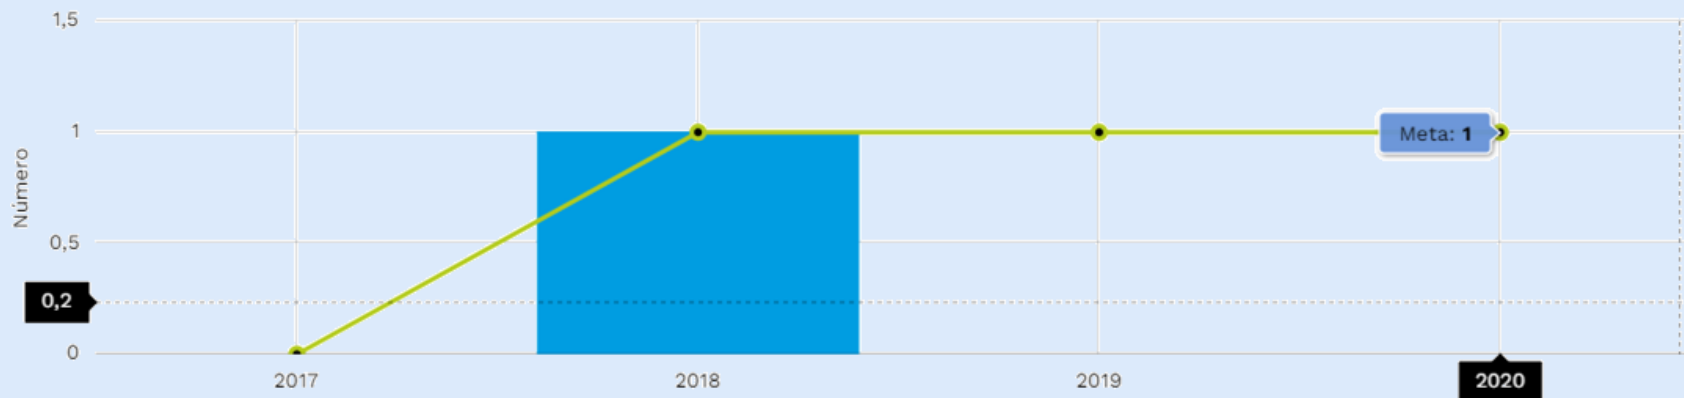

Nota:

- El rezago de este indicador es de 9 meses, por lo tanto el reporte cualitativo del 2019 se realizará en el mes de septiembre.

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

Otras acciones que contribuyen al cumplimiento del punto 1

Asociación de proyectos con concepto de viabilidad técnica favorable, vigencia 2019



19 apoyo a
infraestructura



23 dotación
medica



3 apoyo
formulación
de proyecto



14 Departamentos PDET
presentaron proyectos de
infraestructura y
dotación hospitalaria
para **31** municipios PDET

45 Proyectos presentados

17 proyectos con concepto técnico favorable

Timbiquí
Rioblanco
Ataco
Montelíbano
Santander de Quilichao
Valledupar
Santa Marta D.T.C e H.
Saravena



8 Proyectos de
apoyo a
infraestructura



9 proyectos
de dotación
medica

San José del Guaviare
Santa Marta D.T.C e H.
Valledupar
Los Palmitos
Florencia
López de Micay
San Juan del Cesar (2)
Puerto Libertador

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

Otras acciones que contribuyen al cumplimiento del punto 1

Transferencia de recursos PGN – Nación para infraestructura, dotación o transporte en municipios PNSR y PDET*, vigencia 2019



* Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

Punto 3: Fin del conflicto

Pilar 3.2: Reincorporación de las FARC EP a la vida civil

Reincorporación social y económica

Indicador		Avance cuatrienio
1	Proyecto(s) de cooperación para cubrir los costos que excepcionalmente se generen de la atención de enfermedades de alto costo y/o lesiones derivadas del conflicto de los miembros acreditados de las FARC-EP, presentados en especial en los primeros 36 meses	80%
2	Porcentaje de integrantes de las FARC-EP acreditados con lesiones derivadas del conflicto, que acceden a la Ruta Integral de Atención (RIA) correspondiente	0%



AVANCE 40%

- A través de las Rutas Integrales de Atención en Salud, en 2019 accedieron a procedimientos en salud relacionados con rehabilitación funcional 369 personas con discapacidad (35% de la población objeto)
- Se presentó y aprobó proyecto de cooperación con la Unión Europea.


Nota:

- El indicador relacionado con las atenciones está en proceso de ajuste en la CSIVI desde febrero de 2019, por tal motivo no se ha podido hacer reporte en la plataforma SIIPO. Sin embargo, el Ministerio ha venido realizando el seguimiento a las atenciones de personas con discapacidad, si llega a ser aceptada la solicitud, el avance real de este punto sería del 75%, frente a las metas propuestas para el cuatrienio

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA	CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	Estado de plazo del indicador	Estado formulación de ficha	Reporte cuantitativo 2019	Reporte cualitativo 2020
Grupo de Cooperación Internacional	C.449	Proyecto(s) de cooperación para cubrir los costos que excepcionalmente se generen de la atención de enfermedades de alto costo y/o lesiones derivadas del conflicto de los miembros acreditados de las FARC-EP, presentados en especial en los primeros 36 meses.	En término	Aprobada	Actualizado	Actualizado
Oficina de Promoción Social	C.242	Porcentaje de integrantes de las FARC-EP acreditados con lesiones derivadas del conflicto, que acceden a la Ruta Integral de Atención (RIA) correspondiente	En término	Solicitud de ajuste CSIVI	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte

Avance cuantitativo del indicador VS la meta (Por vigencia)

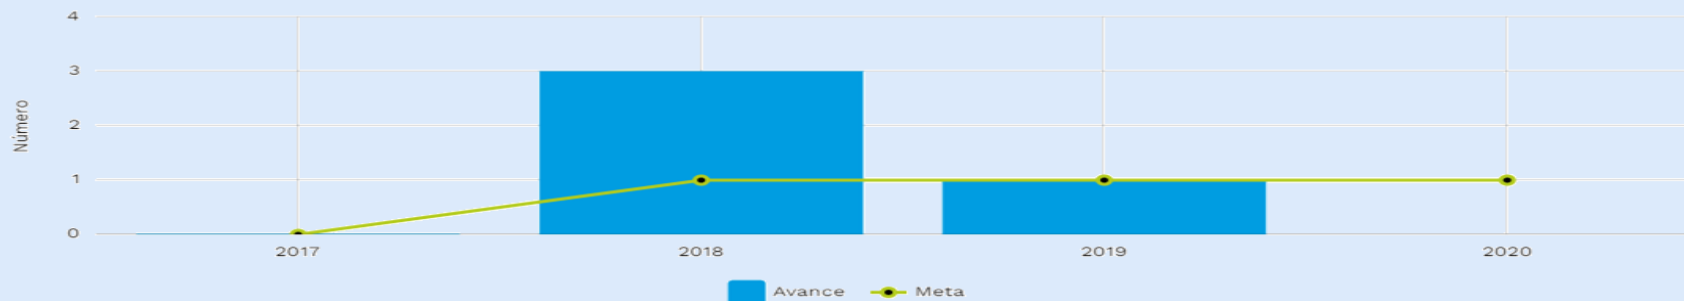

Proyecto(s) de cooperación para cubrir los costos que excepcionalmente se generen de la atención de enfermedades de alto costo y/o lesiones derivadas del conflicto de los miembros acreditados de las FARC-EP, presentados en especial en los primeros 36 meses.

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

Punto 5: Acuerdo sobre la víctimas del conflicto

Pilar 5.4: Reparación integral para la construcción de paz

Rehabilitación Psicosocial



AVANCE 20,15%

	Indicador	Avance cuatrienio
1	Víctimas atendidas a través de estrategias móviles de rehabilitación psicosocial en los lugares más apartados	0%
2	Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la No Repetición, implementado	25%
3	Mujeres víctimas con atención y/o acompañamiento psicosocial para la recuperación emocional de acuerdo a la línea de atención diferenciada a mujeres y grupos étnicos	55,5%
4	Número de sujetos de reparación colectiva que producto de un proceso de socialización y sensibilización apropiado culturalmente solicitan, se vinculan y acceden a la atención psicosocial con pertinencia cultural, con perspectiva de mujer, familia y generación acorde a los decretos ley 4633, 4634 y 4635 en el marco de los módulos étnicos y la ruta de atención integral en salud para víctimas indígenas	0%

- Articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD); articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
- 93% de la población víctima afiliada al SGSSS
- 68.409 mujeres con atención psicosocial
- 3 sujetos de reparación colectiva con atención psicosocial


Nota:

- El indicador relacionado con la atención a sujetos de reparación colectiva esta en proceso de ajuste en la CSIVI desde febrero de 2019, por tal motivo no se ha podido hacer reporte en la plataforma SIPO. Sin embargo, el Ministerio ha venido realizando el seguimiento; si se acepta esta solicitud, el avance real de este punto sería 32,5%. Por otro lado es importante mencionar que el indicador relacionado con la atención en zona apartadas inició su ejecución el 2019 y tiene 6 meses de rezago, por tal motivo no registra avance aún.

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA	CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	Estado de plazo del indicador	Estado formulación de ficha	Reporte cuantitativo 2019	Reporte cualitativo 2020
Oficina de Promoción Social	E.452	Víctimas atendidas a través de estrategias móviles de rehabilitación psicosocial en los lugares más apartados	En término	Aprobada	Rezago de 6 meses	Actualizado
	E.317	Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la No Repetición, implementado	En término	Aprobada	Actualizado	Actualizado
	E.G.2	Mujeres Víctimas con atención y/o acompañamiento psicosocial para la recuperación emocional de acuerdo a la línea de atención diferenciada a mujeres y grupos étnicos	En término	Aprobada	Actualizado	Actualizado
	E.E.4	Número de Sujetos de reparación colectiva que producto de un proceso de socialización y sensibilización apropiado culturalmente solicitan, se vinculan y acceden a la atención psicosocial con pertinencia cultural, con perspectiva de mujer, familia y generación acorde a los decretos ley 4633, 4634 y 4635 en el marco de los módulos étnicos y la ruta de atención integral en salud para víctimas indígenas	En término	Solicitud de ajuste CSIVI	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte

Modalidad de atención



Sexo




16% población étnica
13% no informa
71% ninguna

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

Punto 4: Solución al problema de las drogas

Pilar 4.2: Prevención del consumo y salud pública



Prevención del consumo

AVANCE 15,08%

	Eestrategia	Avance cuatrienio
1	Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas	0%
2	Programa Nacional de Intervención Integral Frente al Consumo de Drogas Ilícitas.	15,08%

- Adopción de la Resolución 089 de 2019).
- 77.440 personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, atendidas
- 21 Direcciones Territoriales de Salud asistidas técnicamente en el proceso de elaboración del Plan de Acción en Salud en la vigencia 2020
- Concertación del lineamiento de armonías espirituales de los pueblos indígenas

Nota:

- *El indicador relacionado con la creación del sistema y el programa están en proceso de ajuste en la CSIVI desde junio de 2019, por tal motivo no se ha podido hacer reporte en la plataforma SIPO. La dependencia tiene 3 indicadores vencidos, y la mayoría de sus compromisos inician ejecución en esta vigencia, como lo son la implementación de estrategias para disminuir el estigma y la discriminación, la creación del sistema de seguimiento, y la implementación del lineamiento de armonías espirituales, el cual no hace parte del avance presentado.*

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA	CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	Estado de plazo del indicador	Estado formulación de ficha	Reporte cuantitativo 2019	Reporte cualitativo 2020
Dirección de Promoción y Prevención	D.276	Porcentaje de territorios afectados por cultivos de uso ilícito con brigadas de salud realizadas a solicitud	Cumplido	Aprobada	Actualizado	NA
	D.291	Acto administrativo de creación del Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas expedido	Incumplido	Solicitud de ajuste CSIVI	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte
	D.292	Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas creado y en funcionamiento	En término	Ajuste dependencia	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte
	D.294	Documento de política frente al consumo de drogas ilícitas actualizada, con participación de la comunidad	Cumplido	Aprobada	Actualizado	NA
	D.295	Porcentaje de departamentos acompañados en la formulación y ejecución plena de planes departamentales para la promoción de la salud, prevención, atención del consumo de sustancias psicoactivas	En término	Aprobada	Actualizado	Actualizado
	D.435	Sistema de seguimiento de las acciones territoriales que se adelantan en el tema de consumo, diseñado y en funcionamiento	En término	Aprobada	Actualizado	Actualizado
	D.462	Porcentaje de personas que reciben tratamiento por consumo de sustancias ilícitas	En término	Aprobada	Actualizado	Actualizado
	D.G.6	Número de estrategias para disminuir el estigma y la discriminación en personas que consumen sustancias psicoactivas con enfoque de genero, incluyendo población LGBTI	En término	Aprobada	Actualizado	Actualizado

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA	CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	Estado de plazo del indicador	Estado formulación de ficha	Reporte cuantitativo 2019	Reporte cualitativo 2020
Dirección de Promoción y Prevención	D.G.7	Lineamientos de tratamiento con enfoque de género, incluyendo población LGBTI, dentro del Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, que permitan disminuir las brechas de acceso al sistema de salud, elaborados.	Vencido	Aprobada	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte
	D.G.9	Porcentaje de personas que reciben tratamiento por consumo de sustancias ilícitas	En término	Aprobada	En término	En término
	D.E.9	Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas ilícitas, como una instancia de alto nivel, diseñado e implementado de forma socializado con las instancias de representación reconocidas (Plan de Desarrollo 2010-2014 y anexos; Subcomisión de Salud de la Mesa de Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas; la Comisión Tercera de Protección Social; ICBF; Mujer, Género y Generación del Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negra, Afro, Raizal y Palenquera creada por Ministerio del Interior; y Mesa Nacional de Dialogo del Pueblo Rrom), para garantizar un enfoque étnico con pertinencia cultural y perspectiva de género, mujer, familia y generación.	Vencido	Solicitud de ajuste CSIVI	Sin iniciar reporte	Sin iniciar reporte

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA	CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	Estado de plazo del indicador	Estado formulación de ficha	Reporte cuantitativo 2019	Reporte cualitativo 2020
Dirección de Promoción y Prevención	D.E.10	Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA, consultada con las instancias de representación reconocidas (Plan de Desarrollo 2010-2014 y anexos; Subcomisión de Salud de la Mesa de Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas; la Comisión Tercera de Protección Social; ICBF; Mujer, Género y Generación del Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negra, Afro, Raizal y Palenquera creada por Ministerio del Interior; y Mesa Nacional de Dialogo del Pueblo Rrom), para garantizar un enfoque étnico con pertinencia cultural y perspectiva de género, mujer, familia y generación.	En término	Aprobada	Actualizado	Actualizado
	D.E.11	Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA, implementada garantizando un enfoque étnico con pertinencia cultural y perspectiva de género, mujer, familia y generación.	En término	Aprobada	NA	N. A.

Nota:

- La fichas técnicas el indicador D.E.9 continúan en proceso de aprobación por parte del DNP dado que desde Marzo se solicitó el ajuste del nombre del indicador de los mismos. Este proceso debe de elevarse a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI) por lo tanto no se tiene respuesta aún. Debe remitirse la ficha técnica del Indicador D.291 para continuar el proceso de ajuste solicitado al DNP.
- Los indicadores D.292 Y D.E.11 tuvieron que solventar un proceso de análisis jurídico para definir el alcance de los mismos; está pendiente el envío de la ficha técnica del primero.
- Por otro lado, es importante mencionar la necesidad de la formulación del plan de trabajo e los indicadores que correspondan hasta la vigencia 2022, y el reporte de los indicadores que ya están aprobados.

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN



La implementación del Acuerdo Final de Paz parte del marco general del ciclo de política pública, identificación de los compromisos, definición de la respuesta institucional, formulación de acciones, focalización de recursos, y el seguimiento. Con el objetivo de dar cuenta a estos procesos, desde la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales se ha brindado un acompañamiento a las dependencias frente a la implementación de cada una de las herramientas definidas para tal fin. De este proceso se resalta:

- Los 32 indicadores tienen fuente de financiación definida.
- Los 6 indicadores de género del **PMI** vienen ejecutando un plan de acción para su cumplimiento.
- Los 4 indicadores étnicos del PMI tiene plan de acción elaborado.
- Los indicadores temáticos del PMI tiene plan de acción parcialmente elaborado.
- 16 Indicadores reportados
- 8 indicadores con solicitud de ajuste
- 8 indicadores pendientes de validación de ficha técnica
- 4 indicadores incumplidos
- El Plan Nacional de salud Rural no se encuentra adoptada

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN



Salud Rural y PDET (Punto 1)

- 32 departamentos cuentan con los planes de acción de MAITE
- \$22.015.748.262 invertidos en municipios PDET para infraestructura y dotación en 2019
- Proyecto Salud para la Paz (USD \$2.000.000): fortalecimiento institucional y jornadas extramurales

Reincorporación y ETCR (Punto 3)

- \$2.315.520 transferidos a hospitales públicos para Esquema de Salud en ETCR en 2019
- Más de 5.800 atenciones a través del Esquema de Salud en los ETCR en 2019
- 12.239 personas en proceso de reincorporación afiliados al SGSSS
- Aseguramiento se traduce en acceso: ej. 51.166 servicios autorizados por Nueva EPS

Prevención del consumo de sustancias psicoactivas (Punto 4)

- Adopción de la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas
- Protocolización del lineamiento para el cuidado de la salud mental y las armonías espirituales de los pueblos indígenas, en el marco del SISPI

Atención psicosocial a víctimas (Punto 5)

- 68.409 mujeres atendidas a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas en el 2019.
- Articulación con los Mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

A solid blue background featuring the word "Gracias" repeated several times in a white, sans-serif font. The text is oriented diagonally, with some instances appearing upright and others rotated, creating a layered, artistic effect.
